



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI



RAPPORT FINAL
SUIVI DES INFRASTRUCTURES : CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT DE CASES DE SANTE



Décembre 2005



MS et Associés


Sicap Sacré Cœur 3 villa n°33 Dakar – Sénégal – BP : 24186 – Tel : 865 11 80/ Fax : 867 23 79 E.mail : masow@sentoo.sn / msadakar@sentoo.sn



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI



RAPPORT FINAL
SUIVI DES INFRASTRUCTURES :
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT
de
CASES DE SANTE

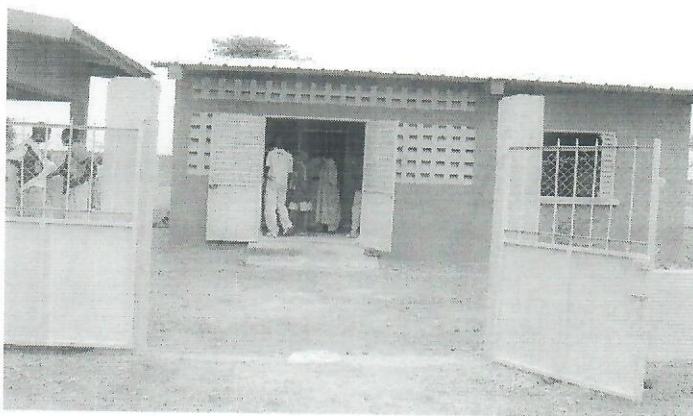

MS et Associés

Sicap Sacre Cœur 3 villa n°33 Dakar – Senegal – BP : 24186 – Tel : 865 11 80/ Fax : 867 23 79 E.mail : masow@sentoo.sn / msadakar@sentoo.sn

DMP N° KLKA / IE – 022 – 04

NDIOTTE BIRAME

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Dental
N° du Micro-Proj	KLKA / IE -022-04
Titre du Micro-Proj	Achèvement et Equipement de la Case de Nditté Birame
Maître d'Œuvre	Gade KOUNTA
Montant du	800 000
Entreprise	E.El Hadji Cheikh Diallo
Montant Offre	7 193 286
Apport Bénéficia	507 725
Montant Marché	6 685 432
Date de Signature	06/03/2005
Date de Démarrage	11/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison	25/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Ndiotté Birame
Communauté Rurale	Dianké Souf

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Malick	SOW
	CTMO	Djiby	BA
	CTMO	Moussa	SY
	CTMO	Djibril	BA
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Moussa	SOW

Désignation des éléments de l'Ouvrage	SUIVI PHYSIQUE				
	Prévu			3	4
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état	Réalisé %	Ecart %
Bâtiment principal	Terrassement		100	100	0
	décaissement et reprise de remblais sous dallage	100		100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Décapage et reprise d'enduit	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie(serrures)		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	0	100
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	0	100
Brûleur de Déchets	I/Terrassement		100	0	100
	Gros Œuvre		100	0	100

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISATION	SOLDE	
			MONT		
6762412	6685432	76980	76000	980	Reliquat utilisé pour l'installation d'une toilette intérieure pour matrone.

SYNTHESE											
CONSTRUCTION					EQUIPEMENT		FOURNITURES				
REPÈRES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
11/03/2005	45 j	#####	100%	117j	72j			oui		oui	
Déficit de mobilisation de la communauté.Présence effective de l'entrepreneur.Personnel qualifié.Bonne maîtrise du chantier.Bonne organisation.Suivi régulier et assidu de la maîtrise d'œuvre.Bonne qualité des prestations.Résultat satisfaisant.Il y a par contre à souligner l'insuffisance des ressources financières.											
Doter la structure d'un poste de téléphonie rural à alimentation solaire. Et d'un système d'éclairage solaire.Demander à la communauté de planter des arbres tout au tour de la case en guise de brise vent..Doter la structure d'une ambulance hippomobile											

D M P N°: KLKA /I E -017-04

KHOUROU
NDIOBENE

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Bok Xalat de Khourou Ndiobéne
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -017-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Khourou Ndiobéne
Maître d'Œuvre	Adrien MALOU
	600 000
Entreprise	GIE Khadimou Rassoul
	9 341 437
Apport Bénéficiaires	745 966
Montant Marché	8 595 471
Date de Signature du Contrat	9/03/2005
Date de Démarrage	14/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	28/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de Mission
Village	Khourou Ndiobéne
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT

Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Mansour DIOUF
	CTMO	Modou Awa NIANG
	CTMO	Khardiatou SOW
	CTMO	Fatou SALL
	CTMO	Samba Maram DIALLO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa BA

SITUATION

KHOUROU NDI OBENE

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalis é%	4 Ecart %
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Case Accompagnants	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCH E	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
9041074	8595471	445603		445603	.Prévoir un montant pour installation réseau d'alimentation en eau.demande d'utilisation du reliquat introduite pour l'installation de téléphone solaire rural

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT		FOURNITURE			
REPERES			INDICATEURS				SITUATION		SITUATION		
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
14/03/2005	45 j	29/09/2006	100%	201j	156j			oui		oui	

OBSERVATIONS	manque de jeunes dans le village.Manque de moyens financiers et matériels.Manque d'organisation..Accès difficile en hivernage.Durée des travaux excessif plus que 120jours acceptables.Suivi non régulier
RECOMMANDATIONS	Installer un réseau d'alimentation en eau potable pour une bonne hygiène et l'entretien de la structure.Désenclaver la localité par l'installation de téléphonie mobile.Doter la structure d'ambulance hippomobile

D M P N°: KLKA /I E -026-04

SARE SADIO

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE de Saré Sadio
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -020-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Saré Sadio
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant du contrat	650.000
Entreprise	SOPRESCOM
Montant Offre	9.259.676
Apport Bénéficiaires	809.716
Montant Marché	8.449.424
Date de Signature du Contrat	5/03/2005
Date de Démarrage	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	24/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de Mission
Village	Saré Sadio
Communauté Rurale	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Yéro DIALLO
	CTMO	Mamady DIALLO
	CTMO	Djebel DIALLO
	CTMO	Goumala DIALLO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Saye LO

I/SITUATION PHYSIQUE

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % non	2 % non		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE						OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIGAT				
		MONTAN T	UTILIS ATION	SOLDE		
			MONT			
9041074	8449960	591114	0	591114	besoins formulés mais demande non rédigée. Prévoir un montant pour installation réseau d'alimentation en eau	

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT		FOURNITURE			
						T		S			
REPERES			INDICATEURS			SITUATION		SITUATION			
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classe ment Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
10/03/2005	45 j	08/11/2005	100%	243j	198j			oui			oui

Démotivation de la communauté par la durée des travaux. Absence total et criarde de moyens de la part de l'entreprise. Manque total d'organisation. Incapacité à exécuter un chantier de plus de 5 million. Ne mérite pas un quelconque agrément. Incapacité totale. Qualité des prestations médiocres. Laxisme dans le suivi de la maîtrise d'oeuvre. Accès difficile en itinéraire bien que le village soit situé à environ 3km hippomobile.

RECOMMANDATION

D M P N°: KLKA /I E -015-04

TAÏF NDIOUM

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	A S C Taïf Ndioum
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -015-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Taïf Ndioum
Maître d'Œuvre Montant du contrat	Saliou DEME
	800 000
Entreprise Montant Offre	Ndiambour Entreprise
	8 062 217
Apport Bénéficiaires	745 966
Montant Marché	7 316 251
Date de Signature du Contrat	13/03/2005
Date de Démarrage	18/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	2/05/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de Mission
Village	Taïf Ndioum
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

TAÏF NDIOUM

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Ibrahima	SAMB
	CTMO	Pathé	FALL
	CTMO	Seyni	TOP
	CTMO	Yama	NDIMBELANE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Idrssa	BA

TAÏF NDILOUM

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

TAÏF NDILOUM

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHÉ	RELIGAT			
		MONTANT	UTILIS	SOLDE	
			ATION		
		MONT			
904104	7316251	1724823	0	1724823	Demande d'utilisation du reliquat pour l'acquisition d'une ambulance hippomobile rédigée mais non encore déposée.

TAIF NDIJUM

SYNTHESE									
CONSTRUCTION					EQUIPEMENT		FOURNITURES		
REPERES		INDICATEURS				SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP
18/03/2005	45 j	27/10/2006	100%	224j	179j		oui		oui

OBSERVATIONS	A ce jour c'est la seule entreprise à n'avoir pas encore levé ses réserves. L'entrepreneur devenant introuvable. Des instructions ont été données au président du CGMP pour lever ces dites réserves avec autorisation de puiser dans le décompte final non encore libéré de l'entreprise. Cette tâche devra être faite sous encadrement du maître d'oeuvre dont l'assiduité est à soulignée aussi. Dynamisme du président du CGMP. Mobilisation très remarquée des femmes.
RECOMMANDATIONS	Installer un réseau d'alimentation en eau potable pour une bonne hygiène et l'entretien de la structure. Doter la case d'une ambulance hippomobile et éventuellement installer un système d'éclairage solaire et installation d'un poste téléphonique.

D M P N°: KLKA /I E -018-04

KEUR ABASS

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Walidane de Keur Abass
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -017-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Keur Abass
Maître d'Œuvre	Adrien MALOU
Montant du contrat	600 000
Entreprise	Ndoyenne Entreprise
Montant Offre	9 671 425
Apport Bénéficiaires	745 966
Montant Marché	8 925 459
Date de Signature du Contrat	9/03/2005
Date de Démarrage	14/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	28/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de Mission
Village	Keur Abass
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

I / SITUATION PHYSIQUE

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3	4
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état	Réalisé %	Ecart %
Brûleur de Déchets	I /Trerrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Case Accompagnants	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCH E	RELIQUAT			
		MONTAN T	UTILI	SOLDE	
			SATIO MONT		
9041174	8925459	115715	0	115715	besoins formulés mais demande non rédigée.Prévoir un montant pour installation réseau d'alimentation en eau

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT		FOURNITURES			
REPERES			INDICATEURS				SITUATION		SITUATION		
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1Durée des travaux	2Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
14/03/2005	45 j	29/09/2006	100%	201j	156j			oui		oui	
OBSERVATION: Site plus ou moins éloigné du village. Absence de motivation de la communauté. Bonne assise financière de l'entreprise mais manque d'organisation... Accès difficile en hivernage. Durée des travaux excessive plus que 120 jours acceptables. Suivi non régulier											
RECOMMANDATION: Installer un réseau d'alimentation en eau potable pour une bonne hygiène et l'entretien de la structure. Doter la structure d'ambulance hippomobile pour l'évacuation des malades au poste de santé de la communauté rurale											

D M P N°: KLKA /I E -016-04

PAFFA

RAPPORT FINAL

PAFFA

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

PAFFA

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Case Accompagnants	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCH E	RELIQUAT			
		MONTAN T	UTILIS ATION	SOLDE	
			MONT		
9041074	7148536	1892538	0	1892538	Demande d'utilisation du reliquat pour l'acquisition d'une ambulance hippomobile rédigée mais non encore déposée.

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT		FOURNITURES			
REPERES						SITUATION		SITUATION			
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
11/03/2005	45 j	30/09/2006	100%	202j	1579j			oui		oui	
OBSERVATIONS En matière de mobilisation ce village reste le plus dynamique. Les retards relevés sont essentiellement dus à un manque criarde de moyens de la part de l'entreprise, bien que la volonté soit présente. Bonne organisation. Bonne qualité des travaux. Conformité technique respectée. Accès difficile en hivernage comme en saison sèche. Suivi de la maîtrise d'oeuvre non régulière.											
RECOMMANDATIONS Doter la case d'une ambulance hippomobile, d'un système d'électrification solaire... Demander à la communauté d'entretenir les arbres déjà plantée et veiller à leur bonne croissance.											

D M P N°: KLKA /I E -014-04

DAROU MBANE

RAPPORT FINAL

DAROU MBANE

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Sant Borom Darou
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -014-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Darou Mbané
Maître d'Œuvre Montant du contrat	Abdoul Youssouf KANE
	800 000
Entreprise Montant Offre	E S C G
	8 346 672
Apport Bénéficiaires	745 966
Montant Marché	7 600 706
Date de Signiture du Contrat	13/03/2005
Date de Démarrage	18/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	2/05/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de Mission
Village	Darou Mbané
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT

Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Mamadou NDIAYE
	CTMO	Saliou NDAW
	CTMO	Aliou NDAO
	CTMO	Omar NDAO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa BA

DAROU MBANE

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé%	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Darou MBANE

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalis é%	4 Écart %
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Case Accompagnants	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Élévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCH E	RELIGAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
MONT					
9041074	7600706	1440368		1440368	.Demande d'utilisatiopn du reliquat pour l'acquisition d'une ambulance hippomobile rédigée mais non encore déposée

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT FOURNITURE					
REPERES			INDICATEURS			SITUATION		SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
13/03/2005	45 j	12/07/2006	100%	122j	77j			oui			oui
Mobilisation permanente de la communauté.Bonne prestation et bonne qualité des travaux.Manne de moyens mais reste néanmoins un entrepreneur d'avenir.Dispose de personnel qualifié.Le village a eu a bénéficié du programme d'électrification rurale et en a profiter pour faire connecter la case.Maisles accessoires ont été installés dans la salle d'observation ce qui réduit l'espace.II avatété demandé à l'entrepreneur de nous soumettre un devis pour le trnsfer des ces accessoires par la construction d'une niche à l'extérieur du bâtiment. Mais jusqu'à ce jour cette proposition na pas été déposée											
Doter le village d'une ambulance hippomobile et prévoir la construction de la niche pour le transfer des accessoires de l'installation solaire.											

D M P N°: KLKA /I E -019-04

IDA GADIAGA

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Mixte de Ida Gadiaga
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -019-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case à de santé à Ida Gadiaga
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant du contrat	650 000
Entreprise	A G T / G C
Montant Offre	9 739 140
Apport Bénéficiaires	809 716
Montant Marché	8 929 424
Date de Signature du Contrat	05/03/2005
Date de Démarrage	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	24/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Ida Gadiaga
Communauté Rurale	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Djiby	NIANG
	CTMO	Oumar	TOURE
	CTMO	Ibou	DIA
	CTMO	Malick	SECK
	CTMO	Ouly	GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zon	Saye LO	

I/ SITUATION PHYSIQUE

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support-Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Case Accompagnants	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCH E	RELIGIAT			
		MONTAN T	UTILIS	SOLDE	
			ATION		
		MONT			
9041074	8929424	111650	100080	11570	Connexion de la structure au réseau d'aduction existant

SYNTHESE													
CONSTRUCTION							EQUIPEMENT		FOURNITURES				
REPERES							SITUATION		SITUATION				
INDICATEURS													
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avan cement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classe ment Génér al	RECE P	NON RECE P	RECE P	NON RECE P	RECE P	NON RECE P
10/03/2005	45 j	14/07/2005	100%	126j	81j			oui			oui		

Difficulté d'approvisionnement en matériaux locaux. Présence permanente de l'entrepreneur. Personnel qualifié. Bonne organisation du travail. N'a été l'attente de la livraison de peinture passée en commande. l'écart serait plus réduit. Cette phase d'attente a duré environ 21 jours

Doter le village d'ambulance hippomobile. Installer un système d'éclairage solaire. Demander à la communauté de créer un brise vent en plantant des arbres tout au tour de la case compte de son exposition et de son isolement

D M P N°: KLKA /I E -023-04

MEDINA SY

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Bok Jom de Médina Sy
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -023-04
Titre du Micro-Projet	Extension et Equipement de la Case de Santé de Médina Sy
Maître d'Œuvre	Bouna DIOUF
Montant du contrat	600 000
Entreprise	Business Center
Montant Offre	6 300 000
Apport Bénéficiaires	484 725
Montant Marché	5 815 275
Date de Signature du Contrat	08/03/2005
Date de Démarrage	13/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	27/04/2005
Date de Réception	19/07/2005
Durée réelle des travaux	150j
Nombre de jours de retard	75j
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Médina Sy
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Assane	DIOUF
	CTMO	Saliou	SECK
	CTMO	Abdou	DIOP
	CTMO	Ibra	DIOP
	CTMO	Ouly	GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zor	Moussa	SOW

Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEURS DE RESULTATS				
	Prévu			3	4
	Désignation	% par Poste	% par Corps d'état	Réalisé %	Ecart %
Case des Soins	Toiture Charpente		100	100	0
	Sous plafond	100		100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Mur de Clôture	Gros Œuvre		100	100	0
	A)Fondations	100		100	0
	B)Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Terrassement		100	100	0
Latrines Extension à 1 Boxe	Gros Œuvre		100	100	0
	A)Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

	Prévu(Période du 13/07 au 12/08)			3	4
	Désignation	%par r Poste	% par corps d'état	Réalisé %	Ecart %
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A)Fondations	100	100	100	0
	Elévation	100	100	100	0
	Peinture		100	100	0
Connection Case au RAEP	Terrassement		100	100	0
	Reseau		100	100	0
	d'eau		100	100	0

II / FINANCIERE						OBSERVATIONS
BUDGET	MARCH E	RELIGUAT				
		MONTAN T	UTILI	SOLDE		
			SATIO N			
5841725	5815275	26450	0	26450		

SYNTHESE												
CONSTRUCTION							EQUIPEMENT		FOURNITURES			
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION		
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 ^{er} Durée des travaux	2 ^e Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP	RECEP
13/03/2005	45 j	19/07/2005	100%	129j	84j			oui		oui		
OBSERVATION												
mobilisation et disipline communautaire à notée: Bonne postition et bonne qualité des travaux. Gestion formalisée de l'entreprise. Il y a aussi à souligner la bonne disposition de l'entrepreneur qui a eu à réaménager une chambre en guise de contribution de sa structure aux efforts de la communauté. Dynamisme du président du CGMP. La cse a été connectée au réseau d'adduction d'eau déjà existant dans le village												
RECOMMANDATION												
Doter la structure d'une ambulance hippomobile. Prévoir une installation électrique en vue de connecter la structure au réseau dont le projet est en gestation.												

D M P N°: KLKA /I E -024-04

KEUR LAMINE

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Groupement d'Alphabétisation des Femmes de Keur Lamine
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -014-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Keur Lamine
Maître d'Œuvre	Thierno Sarr
Montant du contrat	600 000
Entreprise	A G T / G C
Montant Offre	9 703 145
Apport Bénéficiaires	754 600
Montant Marché	8 948 545
Date de Signature du Contrat	04/03/2005
Date de Démarrage	09/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	23/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Keur Lamine
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT		
Statut	Noms	
Président	Sira	CAMARA
CTMO	Babakar	DRAME
CTMO	Signate	CAMARA
CTMO	Lamine	CAMARA
CTMO	Assane	KONTE
Coordonateur	Modou	DIOP
Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Coordonateur	Amath	SY
Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
Animateur de Zone	El Hadj	DIOUM

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3	4
	Désignation	1 % par	2 % par	Réalisé %	Ecart %
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Mur de Clôture	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
	Terrassement		100	100	0
Latrines	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
Case Accompagnants	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE						OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIAQUAT				
		MONTANT	UTILIS		SOLDE	
			ATION	MONT		
9102274	8948545	153729	150000	3729	Utilisation du reliquat pour connecter la case au PAEP déjà existant dans le village	

SYNTHESE									
CONSTRUCTION					EQUIPEMENT		FOURNITURES		
REPERES					INDICATEURS			SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP
09/03/2005	45 j	07/07/2005	100%	121j	76j			oui	oui
Endépît des trois chantiers qu'elle avait en charge l'entreprise a su se positionner par rapport écart sur les délais.En effet réaliser les travaux dans un délai de 120jours reste un délai ressemblable par rapport au volume de travail.Présence permanente de l'entrepreneur.Bonne qualité des prestation.Bonne organisation de travail.capacité à piloter plus de 2 marchés.Mobilisation de la communauté est à noter aussi.									
OBSERVATIONS									
RECOMMANDATIONS									
Doter la structure d'une ambulance hippomobile.Doter la structure d'une installation électrique solaire									

D M P N°: KLKA /I E -025-04

KEUR SAMBA
NDIAMBANE

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Groupement de Promotion Féminine Jubo de Keur Samba Ndiambane
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -025-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé a Keur Samba Ndiambane
Maître d'Œuvre	Thierno SARR
Montant du contrat	600 000
Entreprise	Entreprise Moussa
Montant Offre	8 118 885
Apport Bénéficiaires	754 600
Montant Marché	7 364 255
Date de Signature du Co	043/03/2005
Date de Démarrage	09/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévu	23/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Keur Samba Ndiambane
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Yama	NIANG
	CTMO	Ousmane	TOP
	CTMO	Ousmane	SANE
	CTMO	Malick	BADIANE
	CTMO	Aliou	NDAO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des	Lamine	DIOP
	Animateur de Z	El Hadj DIOUM	

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Case Accompagnants	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE		OBSERVATIONS				
BUDGET	MARCHE				RELICUAT	
					UTILIS MONTAN T ATION MONT	SOLDE
9102274	7364255	1738019		1738019	Utilisation du reliquat pour connecter la case au RAEP déjà existant dans le village	

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMEN T		FOURNITURE S			
REPERES			INDICATEURS				SITUATION		SITUATION		
Date de Démarage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avan cement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classem ent Général	REC EP	NON RECEP	RECE P	NON RECE P
09/03/2005	45 j	21/10/2005	100%	227j	182j			oui			oui

Mobilisation de la communauté insuffisante. L'irrigation excessive de l'entrepreneuse. Prise de décision trop lente par rapport aux urgences et au délai. La totalité des arrets est due à cette situation. Conformité technique et bonne qualité du travail. Un système d'alimentation par pompage manuel a été installé en témoin et bien apprécié par la communauté. Se référer à ce témoin si toute fois l'option e t les recommandations que nous avons formulées de doter l'ensemble des case de santé ne disposant pas de réseau est acceptée et retenue.

Doter la structure d'une ambulance hippomobile. Doter la structure d'une installation électrique solaire et d'une installation de téléphonie solaire. Cela permettra de désenclaver le village dont l'accès en hivernage est plus ou moins difficile

D M P N°: KLKA /I E -026-04

KOO SOCE

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Bantaba
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -026-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Koo Socé
	Omar COLY
Maitre d'Œuvre	
Montant du contrat	650 000
Entreprise	SECO
Montant Offre	8 471 274
Apport Bénéficiaires	754 600
Montant Marché	7 716 674
Date de Signature du C	15/03/2005
Date de Démarrage	20/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Pro	04/05/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Koo Socé
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Bouré	DRAME
	CTMO	Souleymane	CAMARA
	CTMO	Malang	TOURE
	CTMO	Baïdy	TOURE
	CTMO	Awa	CAMARA
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	El Hadi	DIOUM

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3	4
	Désignation	1 %	2 % par	Réali sé%	Ecart %
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réali sé%	4 Ecart %
	Désignation	1 %pa r Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIGAT			
		MONTANT	UTILIS ATION	SOLDE	
9102274	7716874	1385600	0	1385600	Demande d'utilisation du reliquat pour la connection au réseau introduite et accordée mais l'entrepreneur ne sait jusqu'à présent pas manifesté(voir observation tableau de synthèse)

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT		FOURNITURES			
REPERES						SITUATION		SITUATION			
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	Durée des travaux	Écart	Notes	Classement Général	RECEP	NON REC	RECEP	NON REC
20/03/2005	45 j	13/07/2005	100%	114j	66j			oui			oui

en terme de maîtrise de délai pour les ouvrages de génie elle dépasse les autres entreprises. En effet elle a été la dernière à démarrer les travaux. Le marché lui étant attribué après relance suite au désistement de la première attributaire A encourager. Mobilisation permanente de la communauté. Présence effective et permanente de l'entrepreneur qui avait élu domicile dans le village. La demande d'utilisation du reliquat pour la connexion de la case au réseau a été accordée. L'entrepreneur ne se manifestant pas, des instructions ont été données à la communauté pour entamer les travaux en mode régie. Il sera demandé donc au maître d'œuvre de rapprocher du CGMP en vue de l'encadrement nécessaires

Doter la structure d'une ambulance hippomobile. Doter la structure d'une installation électrique solaire et d'une installation de téléphone solaire. Cela permettra de désenclaver le village dont l'accès en hivernage est plus ou moins difficile

D M P N°: KLKA /I E -021-04

DOUBA LAMPOUR

RAPPORT FINAL

Douba Lampour

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	GIE Tessito Baroo
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -021-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case
Maître d'Œuvre	Adryen MALOU
Montant du contrat	650 000
Entreprise	SOPRESCOM
Montant Offre	9 259 676
Apport Bénéficiaires	809 716
Montant Marché	8 449 960
Date de Signature du C	05/03/2005
Date de Démarrage	10/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Pré	24/04/2005
Nombre de jours de r	14/04/1900
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Douba Lampour
Communauté Rurale	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Ibou	NDAO
	CTMO	Mbaye	MANGANE
	CTMO	Mame Samba	MANGANE
	CTMO	Assane	KONTE
	CTMO	Aly	GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zo	Saye LO	

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Puits		100	100	0
	Support Réservoir et Puits		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
	I/Terrassement		100	100	0
Case Accompagnants	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	Elévation	100		100	0
	Toiture Charpente		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILIS		
			ATION	SOLDE	
9041074	8449960	591114	0	591114	besoins formulés mais demande non rédigée.Prévoir un montant pour installation réseau d'alimentation en eau

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT FOURNITURE					
REPERES						SITUATION T			SITUATION S		
INDICATEURS						SITUATION			SITUATION		
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classe ment Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
10/03/2005	45 j	08/11/2005	100%	243j	198j			oui		oui	

Les mêmes observations et remarques formulées à Saré Sadio sont reconduites. L'entreprise étant attributaires des deux marchés a eu le même compartement à Saré Sadio comme ici à Douba Lampour. Démotivation de la communauté par la durée des travaux. Absence total et criarde de moyens de la part de l'Etat. Manque totale d'organisation. Incapacité à exécuter un chantier de plus de 5 millions. Ne mérite pas un quelconque agrément. Incapacité totale. Qualité des prestations médiocres. Laxisme dans le suivi de la maîtrise d'oeuvre. L'entrepreneur n'a pas su profiter de la situation géographique du, sit. (sur la route nationale). Ecart plus que excessif 198 jours

OBSERVATION

RECOMMANDATION

Doter la structure d'un poste de téléphonie rural à alimentation solaire. Et d'un système d'éclairage solaire. Demander à la communauté de planter des arbres tout au tour de la case en guise de brise vent.

D M P N°: KLKA /I E -027-04

PAKABOURY

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'une Case de Santé à Pakaboury
Maître d'Œuvre	Omar COLY
Montant du contrat	720 000
Entreprise	E.Cheikh S.Chérif Diouf
Montant Offre	8 342 452
Apport Bénéficiaires	778 716
Montant Marché	7 563 736
Date de Signature du Co	03/03/2005
Date de Démarrage	08/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévu	22/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Pakaboury
Communauté Rurale	Saly Escale
Arrondissement	Maka Yopp
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Abdou SECK
	CTMO	Assane MBAYE
	CTMO	Omar GUEYE
	CTMO	Inthia BOYE
	CTMO	Ouly GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	El Hadi DIOUM

Pakaboury

I / SITUATION PHYSIQUE					
Désignation des éléments de l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 % par Poste	2 % par Corps d'état		
Case des Soins	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Carrelage		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Mur de Clôture	I/Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B) Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
	Support Réservoir et Bassin		100	100	0
Latrines	Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	A) Fondations	100		100	0
	B / Elévation	100		100	0
	Menuiserie		100	100	0
	Toiture-Charpente		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

Désignation des Composants l'Ouvrage	INDICATEUR DE RESULTATS				
	PREVUS			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	1 %par Poste	2 % par corps d'état		
Brûleur de Déchets	I /Terrassement		100	100	0
	Gros Œuvre		100	100	0
	Bac à cendre	100		100	0
	Bac à Brûler	100		100	0
	Peinture		100	100	0
Case Accompagnants	I/Terrassement		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT			
		MONTANT	UTILISA	SOLDE	
			MONT		
9041174	7563736	1477438	0	1477438	besoins formulés mais demande non rédigée. Prévoir un montant pour installation réseau d'alimentation en eau

SYNTHESE									
CONSTRUCTION					EQUIPEMENT		FOURNITURES		
REPÈRES		INDICATEURS			SITUATION		SITUATION		
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	NON RECEP	NON RECEP
08/03/2005	45 j	22/09/2006	100%	190j	145j			oui	oui
OBSERVATIONS Déficit de personnel de la part de l'entreprise. Manque de moyens financiers et matériels. Manque d'organisation. Mobilisation permanente de la communauté. Accès difficile en hivernage. Durée des travaux excessif plus que 120 jours acceptables. Suivi non régulier									
RECOMMANDA Installer un réseau d'alimentation en eau potable pour une bonne hygiène et l'entretien de la structure.									
