

Etat d'avancement de la mise en œuvre des PAR

❖ **Projet de réhabilitation de la route nationale n°2**

○ **Construction Pont de Ndioum :**

Sur le Pont de Ndioum et ses bretelles d'accès l'ensemble des emprises libérées depuis la fin juin 2013.

Toutefois, la construction des deux (02) structures de remplacement sont en cours avec l'entreprise SOECO, avec cependant un retard sur les délais de reconstruction de la maison de la famille.

Pour ainsi pallier les risques liés à la prise de possession du site par l'entreprise, le MCA-SN a procédé à un relogement temporaire de la famille Niang qui a reçu une indemnité de location le temps que la nouvelle maison soit réceptionnée.

○ **Réhabilitation de la RN2 « section Richard Toll – Ndioum » :**

Le MCA-Sénégal a reçu de la part des collectivités locales les délibérations sur les sites devant abriter les marchés à aménager.

Le groupement CSE/SOSETER procédera à l'aménagement des sites de réinstallation destinés aux PAP marchés. Etant donné que l'aménagement de ces sites sera fait selon le sectionnement de la route, aucun risque n'est prévu sur les délais de libération des emprises.

❖ **Activité RN6**

○ **Lots routiers RN6 (Ziguinchor – Tanaff – Kolda - Vélingara) :**

➤ **RN6 lot 1 : Tronçon Ziguinchor - Tanaff**

En termes de libération des zones rouges, le MCA-SN a mis à la disposition de l'entreprise 03 sections sur 05 ainsi que l'ensemble des déviations et des sites d'emprunt.

Cet état d'avancement du PAR du lot 1 de la RN6 se présente comme suit :

Priorité de libération des emprises	Tronçon	Date planifiée de libération des emprises	Date effective de libération des emprises
3	PK 0-25	31/12/13	non encore effective
1	PK 25-50 y compris toutes les déviations du PK 0 au PK 116	05/11/13	29/10/13
2	PK 50-75	28/11/13	27/11/13
2	PK 75-100	28/11/13	27/11/13
4	PK 100-116	31/12/13	non encore effective
1	Emprunt Diendième	05/11/13	29/10/13

Sur les 02 sections non encore libérées, le processus de constitution des dossiers PAP et de paiement des compensations est très bien avancé.

Le MCA-SN envisage d'anticiper sur la date planifiée de libération des emprises sur les PK 0-25 et PK 100-116

Tableau de l'état d'avancement de la libération des emprises sur le Lot 1 RN6 :

RN6	Total PAP après fusion des PAP doublement impactés	Total PAP marchés (compensation en nature)	Total PAP hors Marchés à compenser en espèces	Total dossiers complétés pour paiement de la compensation hors PAP marché	Total dossiers restants à finaliser hors marché	% d'avancement dossiers PAP complétés	Total PAP compensées à la date du 30 novembre 2013	% d'avancement PAP Compensations à la date du 30 novembre 2013
PK 0-25	432	0	432	346	86	80,09%	341	78,94%
PK 100-116	317	0	317	185	132	58,36%	183	57,73%
Total	749				218			

✓ **RN6 lot 2 : Tronçon Tanaff - Kolda**

Sur le lot 2 de la RN6, sur les 591 PAP recensées, l'ensemble des PAP ont constitué leurs dossiers individuels.

A la date d'aujourd'hui, l'ensemble des emprises sont indemnisées et ont libérées comme indiqué dans le calendrier ci-dessous excepté les 127 PAP marchés hebdomadaires dont les structures seront remplacées par l'entreprise.

Tableau de l'état d'avancement de la libération des emprises sur le Lot 2 RN6 :

Tronçon	Date planifiée de libération des emprises	Date effective de libération des emprises
Emprises PK 0 -PK 10	06/11/13	06/11/13
Emprises PK 10 -PK 35	24/10/13	23/10/13
Emprises PK 35 -PK 60	08/10/13	08/10/13
Emprises PK 60 -PK 72	06/11/13	06/11/13

✓ **RN6 lot 3 : Tronçon Kolda – Vélingara**

Sur le lot 3 de la RN6, sur les 427 PAP recensées, l'ensemble des PAP ont constitué leurs dossiers individuels.

A la date d'aujourd'hui, l'ensemble des emprises sont indemnisées et ont libérées comme indiqué dans le calendrier ci-dessous excepté les 127 PAP marchés hebdomadaires dont les structures seront remplacées par l'entreprise.

Tableau de l'état d'avancement de la libération des emprises sur le Lot 3 RN6 :

Tronçon	Date planifiée de libération des emprises	Date effective de libération des emprises
Emprises PK 0 - PK 26	21/10/2013	09/10/2013
Emprises PK 26 - PK 46	09/10/2013	09/10/2013
Emprises PK 76 - PK 94	01/10/2013	09/10/2013

✓ **RN6 lot 4 : Pont de Kolda**

Les emprises de la zone de déviation (zone prioritaire) ont été libérées depuis la fin mai 2013.

La PAP additionnelle disposante de la bananeraie a été également compensée et l'emprise qu'elle occupe a été libérée.

Il en est de même pour les deux (02) PAP propriétaires d'ateliers de menuiserie métallique installés sur la façade avant du site ont été identifiés.

Par contre, une minimisation a été opérée sur l'emprise des sites de réinstallation des commerçants afin d'éviter d'impacter l'exploitante d'un champs maraicher se situant dans l'emplacement du dalot.

S'agissant de la réinstallation des commerçants et artisans, les travaux de remplacement confiés à l'entreprise CGIM connaissent également des retards. C'est pour cette raisons que le MCA-SN a tenu plusieurs réunions avec le prestataire et un courrier de relance lui a été transmis.

Le MCA-SN est également en train de finaliser une stratégie de relogement temporaire des PAP artisans et commerçants aux fins d'éviter des retards des réclamations de la part de l'entrepreneur.

❖ **Projet Irrigation et de Gestion des Ressources en Eau**

○ **Delta lots 2 et 3**

A la date du 15 novembre 2013, un total de 664 PAP avait été décompté sur le lot 2 Delta, après validation des données et constitution des dossiers, une fiabilisation systématique de la base de données des PAP par bief a été effectué. Ainsi, à la date du 30 novembre 2013, 653 PAP sont décomptées sur le lot 2 Delta. Ces PAP se répartissent comme suit :

- 526 PAP Agricole
- 42 PAP Concessions
- 76 PAP Equipements privés (principalement des bassins, des infrastructures agricoles précaires etc.)
- 9 locataires de concessions

Les tableaux ci-dessous offre une vue globale de l'évolution du processus de paiement des indemnités des PAP. Cependant, il est important de noter les informations complémentaires (à la date du 30 novembre 2013) ci-après sur la mise en œuvre du PAR :

- Sur les 526 PAP Agricoles :
 - 4 PAP sont introuvables ou injoignables pour la signature des documents administratifs
 - Tous les dossiers ont été complétés et envoyés à Dakar en vue du paiement des indemnités
- Sur les 42 PAP Concessions :
 - 4 PAP sont introuvables ou injoignables pour la signature des documents administratifs
 - Tous les dossiers ont été complétés et envoyés à Dakar en vue du paiement des indemnités
- Sur les 76 PAP Equipements privés :
 - 9 PAP sont introuvables ou injoignables pour la signature des documents administratifs
 - Tous les dossiers ont été complétés et envoyés à Dakar en vue du paiement des indemnités
- Sur les 9 locataires de concessions
 - 2 PAP ont refusés de signer, car elles soutiennent avoir fait des investissements sur les bâtiments qu'elles ont louées. Malgré la communication menée envers ces dernières pour leur rappeler que le Projet n'a pas pour vocation de rembourser des investissements privés effectués sur un bien ne leur appartenant pas et que par conséquent elles devraient se rapprocher de leurs bailleurs.


L'état d'avancement se présente comme suit :

Tableau d'Avancement PAR lot 2 Delta

PAP AGRICOLES											
Bief	Nombre Total de PAP	PAP Injoignable ou Introuvable	NB Dossier Complétée (Signature des parties)	% Dossiers complétés	Nb de Dossier restant à compléter	% Dossier à compléter	Dossiers transmis (au 28 11 13)	% Dossiers transmis (au 28 11 13)	Nb de Dossier restant à transmettre	Nb de Dossiers payés (au 28 11 13)	% Paiement au 28 nov. 2013
Gorom Amont	110	1	109	99,09%	0	0,00%	109	99,09%	0	103	93,64%
Lampsar Aval	170	0	170	100%	0	0,00%	170	100%	0	167	98,24%
Lampsar amont	38	0	38	100%	0	0,00%	38	100%	0	35	92,11%
Lampsar médian	98	2	96	97,96%	0	0,00%	96	97,96%	0	91	92,86%
Kassack N&S	38	1	37	97,37%	0	0,00%	37	97,37%	0	35	92,11%
Ngalam	72	0	72	100%	0	0,00%	72	100%	0	72	100%
	526	4	522	99,24%	0	0,00%	522	99,24%	0	503	95,63%

CONCESSIONS ET EQUIPEMENTS PRIVES											
Bief	Nombre Total de PAP	PAP Injoignable ou Introuvable	NB Dossier Complétée (Signature des parties)	% Dossiers complétés	Nb de Dossier restant à transmettre	% Dossier à compléter	Dossiers transmis (au 28 11 13)	% Dossiers transmis (au 28 11 13)	Nb de Dossier restant à transmettre	Nb de Dossiers payés (au 28 11 13)	% Paiement au 28 nov. 2013
Gorom Amont	28	3	25	89,29%	0	0,00%	25	89,29%	0	6	21,43%
Lampsar Aval	7	0	7	100,00%	0	0,00%	7	100%	0	5	71,43%
Lampsar amont	43	4	39	90,70%	0	0,00%	39	90,70%	0	25	58,14%
Lampsar médian	8	0	8	100%	0	0,00%	8	100%	0	7	87,50%

CONCESSIONS ET EQUIPEMENTS PRIVES											
Bief	Nombre Total de PAP	PAP Injoignable ou Introuvable	NB Dossier Complétée (Signature des parties)	% Dossiers complétés	Nb de Dossier restant à transmettre	% Dossier à compléter	Dossiers transmis (au 28 11 13)	% Dossiers transmis (au 28 11 13)	Nb de Dossier restant à transmettre	Nb de Dossiers payés (au 28 11 13)	% Paiement au 28 nov. 2013
Kassack N&S	31	6	25	80,65%	0	0,00%	25	80,65%	0	11	35,48%
Ngalam	1	0	1	100%	0	0,00%	1	100%	0	1	100%
	118	13	105	88,98%	0	0,00%	105	88,98%	0	55	46,61%

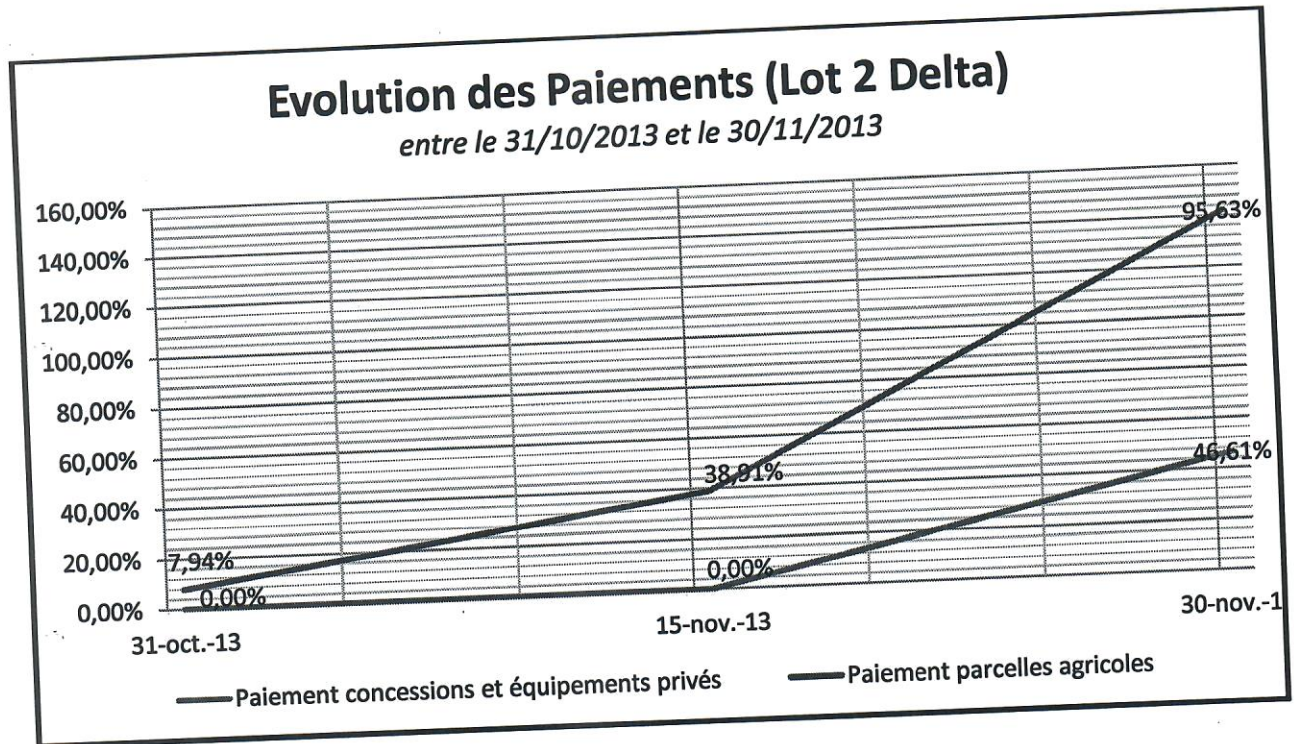

Synthèse Avancement PAR lot 2 Delta

SYNTHESE PAP AGRICOLES CONCESSIONS (Y COMPRIS LES LOCATAIRES) ET EQUIPEMENTS PRIVES

Bief	Nbre Total de PAP	PAP Injoignable ou Introuvable	Nb de PAP paiement en espèces	Nb de PAP paiement en nature	Nb de Dossier bon pour signature	NB Dossier Complétée (Signature des parties) espèces	% Dossiers complétés	Nb de PAP restant espèces	NB Dossier Complétée (Signature des parties) nature	% Dossiers complétés nature	Nb de PAP restant Nature	Nb de dossiers payés	% Paiement au 28 nov. 2013
Gorom Amont	138	4	128	10	134	124	96,88%	0	10	100%	0	109	81,34%
Lampsar Aval	177	0	172	5	177	172	100%	0	5	100%	0	172	97,18%
Lampsar amont	90	6	72	18	77	59	81,94%	7	18	100%	0	66	78,57%
Lampsar médian	106	2	103	3	104	101	98,06%	0	3	100%	0	98	94,23%
Kassack N&S	69	7	58	11	62	51	87,93%	0	11	100%	0	46	74,19%
Ngalam	73	0	72	1	73	72	100%	0	1	100%	0	73	100%
	653	19	605	48	627	579	95,70%	7	48	100%	0	564	88,96%


Tableau d'Avancement PAR Delta lot 3

LOT 3 EMISSAIRE													
Bief	Nombre Total de PAP	PAP Injoignable ou Introuvable	Nb de PAP paiement en espèces	Nb de PAP paiement en nature	Nb de Dossier bon pour signature	NB Dossier Complétée (Signature des parties) espèces	% Dossiers complétés	Nb de PAP restant espèces	NB Dossier Complétée (Signature des parties) nature	% Dossiers complétés nature	Nb de PAP restant Nature	Nb de dossiers payés	% Paiement au 28 nov. 2013
Canal Compensateur Rive Droite	97	0	87	10	97	87	100%	0	10	100%	0	94	96,91%
Canal Compensateur Rive Gauche	36	1	36	0	35	35	97,22%	0	0	0%	0	29	82,86%
Emissaire Djeuss	74	1	74	0	73	73	98,65%	0	0	0%	0	72	98,63%
Canal J	6	0	6	0	6	6	100%	0	0	0%	0	6	100%
	213	2	203	10	211	201	99,01%	0	10	100%	0	201	95,26%

Ainsi à la date du 30 novembre 2013 seule (2) deux dossiers restent non traités sur le lot 3 Delta, car les PAP sont introuvables. Ainsi, *les emprises du Lot 3 delta ont été libérées à la date du 28 novembre 2013.*

Evolution des Paiements (Lot 3 Delta)

entre le 31/10/2013 et le 30/11/2013

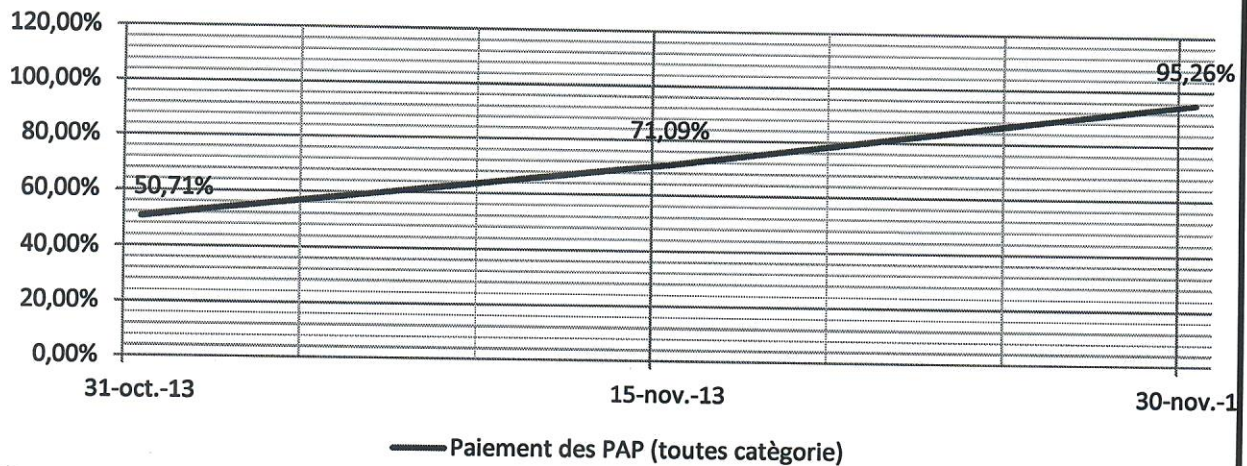

○ Ngallenka

Des activités de suivi de la réinstallation sont menées par l'animateur de l'UMO Ngallenka. Les producteurs en attendant leur retour sur la cuvette, ont développé des stratégies de production sur des terres de location de parcelles. Le MCA-SN a identifié ces nouvelles localisations et en train de procéder à la cartographie.
