



GOVERNEMENT DU SENEGAL

**GEF**

PROGRAMME DES NATIONS UNIES  
POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT  
MONDIAL (FEM)

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2008

### DU PROJET DE GESTION INTEGREE DES ECOSYSTEMES DANS QUATRE PAYSAGES REPRESENTATIFS DU SENEGAL

**UNDAF :** Axe Stratégique de coopération : Création de richesse et lutte contre la faim pour un développement durable.

Effet programme UNDAF : La durabilité des moyens d'existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés dans les zones de concentration du SNU à travers des actions de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles.

#### PRODUITS ATTENDUS :

- (1) Cadre Politique et juridique adapté à une Gestion Intégrée des Ecosystèmes ;
- (2) Développement durable et gestion des ressources naturelles dans les Terroirs Villageois ;
- (3) Conservation et gestion durable des Réserves naturelles communautaires et des Unités Pastorales ;
- (4) Conservation durable et Cogestion des ressources naturelles dans les Aires Protégées ;
- (5) Suivi et évaluation participatifs des écosystèmes ;
- (6) Apprentissage, Evaluation et Gestion adaptative accrue.

Agence de coopération gouvernementale : Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et Lacs Artificiels

**Durée du programme:** Sept 2007 – Fév. 2011  
**Titre du projet:** Projet de Gestion intégrée des écosystèmes dans quatre paysages représentatifs du Sénégal (PGIES).  
**N°ID:** PIMS 2935 – Code Atlas 00054515  
**Durée du projet:** 42 mois  
**Modalité d'exécution :** NEX  
**Budget total :** 5,241, 000 \$ E.U

#### **BUDGET DU PTA 2008**

**FEM :** US \$ 1,433,454 ; F CFA 645 054 300  
**PNUD :** US \$ 400,000 ; F CFA 180 000 000  
**ETAT/BCI :** US \$ 155,555 ; F CFA 69 999 750  
  
**Budget total :** US \$ 1,989,009  
**F CFA 895 054 050**

**PERIODE COUVERTE :** 02 janvier – 31 Décembre 2008

**Approuvé**

Au Nom Du Gouvernement : Titre : \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Au Nom du PNUD/FEM : Titre : \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



### **RESUME**

La phase 2 doit globalement permettre de tester le modèle de gestion de la Conservation Intégrée au Développement de même que la gestion durable des terres et la Conservation de la Biodiversité. La réorientation politique et le renforcement des capacités démarrées en phase 1 seront également poursuivis et consolidés. L'accent sera également mis sur la formulation des mesures d'accompagnement économiques et la mise en œuvre de mécanismes de promotion de moyens d'existence durables avec une restructuration du déploiement des équipes sur le terrain pour prendre en charge la Réserve de Biosphère du Ferlo et la mise à disposition de 15 agents techniques à raison d'un agent par RNC pour une meilleure gestion de proximité. Ce PTA 2008 sera aussi marqué notamment par la réalisation d'une série de pépinières communautaires intégrées servant de pôles de convergence de l'encadrement pour une production massive de plants fruitiers et forestiers, la contribution de la Grande Muraille Verte sur les segments concernant la zone des Niayes et celle du Ferlo, la récupération de terres salées en particulier dans les zones de Gandon et du Delta du Saloum, la protection des forêts contre les feux de brousse, le zonage des réserves de biosphère du Niokolo-Koba et du Delta du Saloum intégrant les réserves naturelles communautaires en cours d'établissement devant leur permettre de se prémunir des mécanismes de fonctionnement requis à toute réserve de biosphère intégrant conservation et développement durable et l'amélioration des équipements des aires protégées.



## LISTE DES SIGLES ET ABREVIATION

AP	:	Aires Protégées
ATEF	:	Agent Technique des Eaux et Forêts
CADL	:	Centre d'Appui au Développement Local
CID	:	Conservation Intégrée au Développement
CITES	:	Convention Internationale sur le Commerce des Espèces en voie de disparition
CL	:	Communauté Locale
CLG	:	Comité Local de Gestion
CR	:	Communauté Rurale
CSE	:	Centre de Suivi Ecologique
DA	:	Direction de l'Agriculture
DAT	:	Direction de l'Aménagement du Territoire
DEEC	:	Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés
DEFCCS	:	Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols
DIREL	:	Direction de l'Elevage
DP	:	Direction de la Planification
DPN	:	Direction des Parcs Nationaux
DPV	:	Direction de la Protection des Végétaux
ECN	:	Ecosystèmes Côtiers des Niayes
FEM	:	Fonds pour l'Environnement Mondial
GdS	:	Gouvernement du Sénégal
GIE	:	Gestion Intégrée des Ecosystèmes
GRN	:	Gestion des Ressources Naturelles
GV	:	Groupement villageois
GZC	:	Gestion des zones côtières
IEF	:	Ingénieur des Eaux et Forêts
IREF	:	Inspection Régionale des Eaux et Forêts
ISE	:	Institut des Sciences de l'Environnement
ITA	:	Ingénieur des Travaux Agricoles
ITE	:	Ingénieur des Travaux d'Elevage
ITEF	:	Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts
MA	:	Ministère de l'Agriculture
MAB	:	Man and Biosphere (l'Homme et la Biosphere)
MEF	:	Ministère de l'Economie et des Finances
MEPNBRLA	:	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et Lacs artificiels
MI	:	Ministère de l'Intérieur
ONG	:	Organisation Non Gouvernementale
PADMP	:	Plan d'Aménagement et de Gestion des AP
PNACB	:	Plan National d'Action pour la Conservation de la Biodiversité
PNDS	:	Parc National du Delta du Saloum
PNNK	:	Parc National de Niokolo-Koba
PNUD	:	Programme des Nations Unies pour le Développement
PROGEDE	:	Projet de Gestion Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution
PTIP	:	Programme Triennal d'Investissement Public
RF	:	Réserve de Faune
RNC	:	Réserve Naturelle Communautaire
RSP	:	Réserve Sylvopastorale
SFICE	:	Sensibilisation, Formation, Information, Communication Environnementale
SNCB	:	Stratégie Nationale pour la Conservation de la Biodiversité
TV	:	Terroirs Villageois
UCP	:	Unité de Coordination du Projet
UNESCO	:	Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture
UP	:	Unité Pastorale
USAID	:	Agence des Etats Unis pour le Développement International



## I- SYNTHESE DU PTA 2008 PAR COMPOSANTE

Globalement, le résumé du PTA 2008 par composante se présente comme suit :

Composantes	Produits attendus	Ressources allouées	
		\$ EU	F CFA
<b>N°1 Cadre politique et juridique adapté à une gestion participative intégrée des écosystèmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une charte locale de bonne gestion des RN harmonisée est élaborée et validée pour servir de guide de référence à la périphérie du PNNK ;</li> <li>• 9 plans et chartes locaux des nouvelles RNC/UP recrutées intégrant l'EIE élaborés et validés ;</li> <li>• 15 plans et chartes locaux des RNC/UP comprenant les terroirs villageois et intégrant l'EIE mis en œuvre ;</li> <li>• PLD prenant en compte les études d'impact environnemental conformément au Code de l'Environnement réactualisés.</li> </ul>	32,877	14 794 650
<b>N°2 Développement durable et gestion communautaire des ressources naturelles effectifs dans les Terroirs Villageois</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un programme SFICE poursuivi dans 15 RNC/UP comprenant 113 villages tests ;</li> <li>• 11 pépinières communautaires intégrées aménagées et opérationnelles ;</li> <li>• Un total de 1 750 000 plants produits dont 30% de fruitiers et 5% pour les espèces endémiques et mondialement menacées pour un test sylvicole ;</li> <li>• Un total de 120 ha de bois de villages est mis en place ;</li> <li>• 200 ha de terres salées régénérées ;</li> <li>• 250 microprojets en cours de mise en œuvre par le biais de mutuelles environnementales d'épargne et de crédit ;</li> <li>• Un réseau Environnemental des Moyens d'Existence Durable des Ecosystèmes mis en place ;</li> <li>• 2000 foyers améliorés confectionnés et en cours d'utilisation.</li> </ul>	543,986	244 793 700
<b>N° 3 Conservation et gestion durable des Réserves Naturelles Communautaire/t Unités Pastorales réalisées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 microprojets d'apiculture sans feu en cours à travers la mise en œuvre de 15 plans locaux d'aménagement et de gestion communautaire des ressources naturelles ;</li> <li>• Les plantes médicinales les plus rares et les plus utilisées identifiées et en cours de régénération ;</li> <li>• 200 km de pare feu ouverts ;</li> <li>• 318 km de pare feu entretenus et bordés par des espèces à usages multiples comprenant le <i>Jatropha curcas</i> ;</li> <li>• <i>Un segment de la Grande Muraille Verte réalisé dans les UP de Loumbol Samba Abdoul et Malandou, dans la communauté rurale de Oudalaye au Ferlo ;</i></li> <li>• <i>Ce segment est implanté dans un espace communautaire doté de plans locaux d'aménagement et de gestion des RN ainsi que de chartes locales d'utilisation durable des ressources naturelles. Les différentes activités prévues prennent en charge l'ensemble des actions actuellement identifiées dans les différentes composantes de la Grande Muraille</i></li> </ul>	628,327	282 747 150




Composantes	Produits attendus	Ressources allouées	
		\$ EU	F CFA
N° 3 Conservation et gestion durable des Réserves Naturelles Communautaire/t Unités Pastorales réalisées (suite)	<p><i>Verte et portant notamment le renforcement des capacités des populations et la mise en place de moyens d'existence durable..</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi de l'évolution du dossier portant statut des écogardes assuré ;</li> </ul>		
N°4 Conservation durable et co-gestion des ressources naturelles dans les Aires Protégées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une étude agrostologique, pédologique et hydrologique pour la lutte contre les plantes envahissantes dans les mares de Simenti et de Kountadala (PNNK) réalisée ;</li> <li>• Aires protégées équipées de 10 postes fixes et 10 mobiles avec leurs antennes BLU d'une portée moyenne de 2 000 km ;</li> <li>• PNNK et PNDS équipés de 2 pirogues motorisées de 10 places de 25 chevaux avec un arbre court en plus 20 gilets de sauvetage ;</li> <li>• Aires protégées équipées de GPS ;</li> <li>• 70 km de pare feux ouverts au Ferlo ;</li> <li>• 105 km de pare feux entretenus au PNNK, au PNDS et au Ferlo.</li> </ul>	383,199	172 439 550
N°5 Ecosystèmes régulièrement suivis et évalués	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un inventaire portant décompte de l'avifaune dans les aires protégées est réalisé ;</li> <li>• Banque de données régulièrement mise à jour et les résultats publiés dans le site Web du PGIES ;</li> <li>• 15 débats communautaires d'évaluation participative des actions du projet dont un par RNC organisés ;</li> <li>• Un second forum sur la cogestion des AP est organisé ;</li> <li>• Un dernier passage de recherches sur les espèces endémiques et mondialement menacées réalisé.</li> </ul>	185,582	83 511 900
N°6 Apprentissage, Evaluation et Gestion adaptative accrue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les deux réserves de faune du Ferlo nord et sud transformées en une réserve de biosphère du Ferlo ;</li> <li>• Fiches/notes techniques élaborées pour une dissémination des actions du Projet ;</li> <li>• Partenariat/Alliance établis dans les différents sites d'action du Projet avec les autres partenaires.</li> </ul>	215,038	96 767 100
RESSOURCES ALLOUEES	FEM	1,433,454	645 054 300
	PNUD	400,000	180 000 000
	ETAT/BCI	155,555	69 999 750
	TOTAL	1,989,009	895 054 050



## II. REPARTITION DU BUDGET DU PTA 2008 PAR COMPOSANTE

### REPARTITION DU BUDGET PAR COMPOSANTE

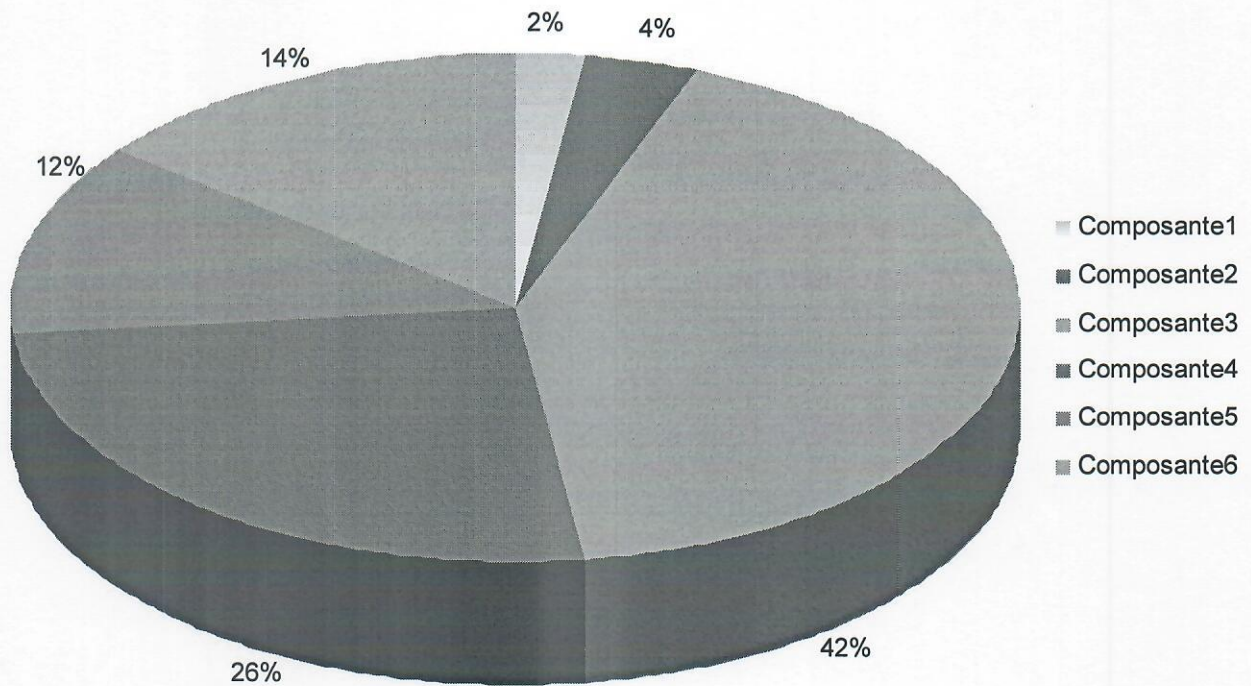



### III- PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DETAILLE (2008)

**OBJECTIF GLOBAL :** Conservation, utilisation durable de la biodiversité d'importance mondiale et renforcement de la séquestration du carbone dans chacun des quatre sites test, effectifs et génèrent des bénéfices à l'échelle nationale et mondiale à partir d'une utilisation durable des ressources et d'un partage équitable des bénéfices.

OMD VISE		OMD N° 7 : Assurer un environnement durable	
ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II		AXE STRATEGIQUE N° 1 : Accélération de la promotion de l'accès aux services sociaux de base (capital naturel)	
ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT		OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Réduire la dégradation des ressources naturelles et de l'environnement	
		PROGRAMME 1. : Gestion du Potentiel Forestier et Faunique	

Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget XI000				Composante PGIES
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008		T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en F CFA X 1000	T1	T2	T3	T4	
1.7. Superficie des RNCs créées et approuvées avec une mise en œuvre des mesures de gestion	1.7.1. 5 000 ha	1.7.1.1. Conduire une étude consultative pour une harmonisation des chartes locales des divers projets. 1.7.1.2. Organiser des ateliers de concertation/validation de la charte locale 1.7.1.3. Elaborer et valider les 9 plans et chartes locaux des nouvelles RNC/UP recrutées en intégrant l'EIE. 1.7.1.4. Mettre en œuvre les 25 plans et chartes locaux					ULP	FEM	Travail	2 500	2 500				Composante 1	
						ULP	FEM	Formation	3 200	3 200					Composante 1	
						ULP	FEM	Formation	6 595	5 000	1 595				Composante 1	
						ULP	FEM		PM	PM	PM	PM	PM		Composante 1	



Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget X1000				Composante PGIES		
			T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en F CFA X 1000	T1	T2	T3	T4			
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008																	
		des RNC/UP en intégrant l'EIE																
		1.7.1.5. Appuyer l'élaboration ou la réactualisation des PLD pour la prise en compte des EIE, conformément au Code de l'Environnement					ULP		FEM				2 500	2 500				
<b>TOTAL COMPOSANTE 1</b>													14 795	10 000	4 795			
<b>Sous Total FEM</b>													14 795	10 000	4 795			



**OMD N° 7 : Assurer un environnement durable**

**AXE STRATEGIQUE N° 1 : Accélération de la promotion de l'accès aux services sociaux de base (capital naturel)**

**OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Réduire la dégradation des ressources naturelles et de l'environnement**

**PROGRAMME 1 : Gestion du Potentiel Forestier et Faunique**

Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget				Composante PGIES
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008		T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en F CFA	T1	T2	T3	T4	
1.4. Superficie des terres reboisées avec un taux de survie d'au moins 60 % ayant l'appui de la DEFCCS (en équivalent ha/an).	1.4.1. 50 000 équivalent ha	1.4.1.1. Equiper un total de 10 pépinières communautaires intégrées en clôture, puits, bassins, adduction d'eau, motopompes et petit matériel dont 2 au Ferlo, 3 au PNNK, 2 au PNDS et 3 dans les Niayes.	↕				62000	FEM	Equip	50 000	50 000					
		1.4.1.2. Equiper les 15 Agents techniques mis à la disposition du projet en motos de 125 CC.	↕				62000	FEM	Equip	15 000	15 000					
		1.4.1.3. Mettre en place 10 pépinières communautaires intégrées aménagées et fonctionnelles dont 2 au Ferlo, 3 au PNNK, 2 au PNDS et 3 dans les Niayes.avec une production totale de 1 750 000 plants dont 30% de	↕				62000	FEM	Contrat	29 000	10 000	9 500	9 500			







Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget				Composante PGIES	
			T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en F CFA	T1	T2	T3	T4		
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008	1.4.1.7. Restaurer 200 ha de zones humides dégradées dont 80 au PNNK, 70 au PNDS et 50 dans les Niayes. 1.4.1.8. Fertiliser 250 ha de terres arables avec du compost amélioré dont 50 au PNNK, 100 au PNDS et 100 dans les Niayes 1.4.1.9. Planter et entretenir 120 km de brise-vents et haies vives 1.4.1.10. Mettre en valeur 2 000 ha de terres avec une gestion agro-sylvopastorale intégrée dont 1000 au Ferlo, 500 au PNNK, 300 au PNDS et 200 dans les Niayes. 1.5.1.1. 2 020 nouveaux foyers améliorés confectionnés et en cours d'utilisation dont 300 au Ferlo, 700 au PNNK, 500 au PNDS et 520 dans les Niayes.		↕			ULP				PM						Composante e2
				↕			ULP	62000	FEM	Contrat	2 000		1 000	1 000			Composante e2
				↕			ULP	62000	FEM	Contrat	PM						Composante e2
				↕			ULP				PM						Composante e2
1.5. Promotion des techniques et technologiques alternatives de production et de consommation d'énergie domestique ligneuse				↕			ULP	62000	FEM	Contrat	4 500		2 000	2 500			Composante e2



Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget				Composante PGIES			
			IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008	T1	T2		T3	T4	Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en F CFA	T1	T2		T3	T4	
Sous total Programme 1 CDS-MT														75 000	12 500	20 127	6 500		114 127



<b>OMD VISE</b>		<b>OMD N° 7 : Assurer un environnement durable</b>	
<b>ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II</b>		<b>AXE STRATEGIQUE N° 1 : Accélération de la promotion de l'accès aux services sociaux de base (capital naturel)</b>	
<b>ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT</b>		<b>OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Réduire la dégradation des ressources naturelles et de l'environnement</b>	
		<b>PROGRAMME 2 : Promotion des comportements citoyens en faveur de l'environnement</b>	

Indicateurs de résultats du CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008	Contributions PGI ES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Composante PGI ES				
			T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en FCFA X1000		T1	T2	T3	T4
2.1. Appuis consentis aux initiatives en matière d'éducation environnementale (formelle/informelle)	2.1.1. Evolution positive	2.1.1.1. Organiser 46 sessions de formation de formateurs sur les thématiques de : lutte contre les feux de brousse, gestion du micro crédit et des mutuelles, techniques de mise en œuvre des micro projets, CES/DRS, techniques de pépinières, régénération naturelle assistée, aquaculture, embouche, planification et S/E et gestion des conflits.					ULP	62000	FEM	Contrat	8 0 0 0	4 0 0 0	2 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 0	Composante 2
		2.1.1.2. Informer et sensibiliser les acteurs concernés sur les programmes de gestion pastorale, de micro crédit, le rôle des organes mis en place et les fonctions des membres de ces organes.					ULP	62 000	FEM	Missions	PM					Composante 2
		2.1.1.3. Organiser les CVD, les CIVD et les organes des mutuelles concernées par les nouvelles RNC/UP.								Missions	PM					Composante 2
2.2. Nombre d'élus locaux sensibilisés et formés en matière d'éducation	2.2.1. 120 élus locaux formés en matière d'éducation	2.2.1.1. Formation des élus locaux en matière de planification, d'aménagement, d'EIE et de									PM					Composante 2



Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT		Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget				Composante PGI ES	
									Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en FCFA X1000	T1	T2	T3	T4		
environnementale	CIBLES PLANIFIEES 2008	environnementale	gestion des conflits															
			2.2.1.2. Organiser un forum sur la transhumance	↕			ULP	62 000	FEM		6 000							
2.3. Nombre de bois d'école		2.3.1. Plus 100 bois d'école mis en place	2.3.1.1. Mettre en œuvre le plan d'action d'éveil des consciences environnementales dans 4 écoles tests avec une mise en place d'un jardin/verger scolaire.	↕			ULP	62 000	FEM	Equip	5 500	3 500	2 000					Composante 2
2.4. Promotion des moyens d'existence durable pour des options alternatives d'utilisation durable des RN.			2.4.1.1. Planter un total de 15 mutuelles environnementales opérationnelles dont 3 au Ferlo, 6 au PNINK, 1 au PNDS et 5 dans les Niayes dont 6 nouvelles avec une organisation des instances locales pour le financement d'environ 250 micro projets.	↕			UCP	4 000	PNUD		29 250	29 250	PM	PM	PM			Composante 2
2.5. Un Réseau Environnemental des Moyens Durables Ecosystèmes (REMEDE) mis en place			2.5.1.1. Etude consultative pour une mise en place du REMEDE	↕			UCP	4 000	PNUD	Contrat	3 600	3 600	PM	PM	PM			
2.6. Personnel, logistique et fonctionnement			2.6.1.1. Mise en œuvre et maintenance des équipements.	↕			UCP	62 000	FEM	Contrat	8 937	4 500	2 000	1 000	1 437			
				↕			UCP	4 000	PNUD	Contrat	1 800	700	500	400	200			



Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT		Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget				Composante PGI ES			
				T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en FCFA X1000	T1	T2	T3	T4				
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008																			
		2.6.1.2. Missions et ateliers					UCP	4 000	PNUD	Contrat	4 497	1 497	1 000	1 000	1 000					
		2.6.1.3. Salaire de l'Assistant chargé de la promotion des moyens d'existence durable					UCP	62 000	FEM	Contrat	18 108	4 527	4 527	4 527	4 527					
		2.6.1.4. Assurances et divers					UCP	4 000	PNUD	Contrat	4 805	1 202	1 201	1 201	1 201					
		2.6.1.5. Indemnités des agents mis à la disposition du projet						62 000	FEM	Contrat	5 171	3 000			2 171					
		2.6.1.6. Prise en charge des impôts sur salaire du personnel							BCI		7 200	1 800	1 800	1 800	1 800					
									BCI		27 800	6 950	6 950	6 950	6 950					
Sous total Programme 2 CDS-MT											130 668	64 526	27 978	20 049	18 115					
TOTAL COMPOSANTE 2											244 795	139 526	40 478	40 176	24 615					
Sous-Total FEM											165 843	94 527	29 027	28 825	13 464					
Sous-Total PNUD											43 952	36 249	2 701	2 601	2 401					
Sous-Total BCI											35 000	8 750	8 750	8 750	8 750					























Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget x 1000				Composante PGIES	
			T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en F CFA x	T1	T2	T3	T4		
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008	1.2.1.3. Ouvrir 70 km de pare-feux au Ferlo.					UCP	62 000	FEM	Contr	24 000	8 000	16 000				Composante 4
		1.2.1.4. Entretien 105 km de pare-feux dont 50 au PNNK, 20 au PNDS et 35 au Ferlo.					ULP	62 000	FEM	Contr	7 200	7 200					Composante 4
		1.2.1.5. Réparer les vannes des ponts de Ndiakher, BountBat et Albar (Gandon)					ULP	62 000	FEM	Contr	5 000	5 000					Composante 4
		1.2.1.6. Organiser un atelier sur les options des feux précoces au PNNK					ULP	62 000	FEM	Contr	2 000	2 000					Composante 4
		1.2.1.7. Aménager des fenêtres de vision autour des mares, réfectionner les salines naturelles et créer de nouvelles autour des grandes mares au PNNK					ULP	62 000	FEM	Contr	2 500	2 500					Composante 4
		1.2.1.8. Aménager 3 flots e nification des oiseaux dans la Réserve de Faune de Geumbeul.					ULP	62 000	FEM	Contr	2 400	2 400					Composante 4
		1.2.1.9. Encourager le développement de l'écotourisme dans 3 campements à la périphérie des AP à Missirah, Dar-Salam et					ULP	62 000	FEM	Contrat	4 000	4 000					Composante 4



Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Composante PGIES				
			T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en FCFA x		Répartition trimestrielle du budget x 1000			
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008											T1	T2	T3	T4	
		Loupoul														
1.3. Personnel, logistique et fonctionnement		1.3.1.1. Salaires des 4 Assistants Techniques des sites du projet et des chauffeurs	↔	↔	↔	↔	UCP	62 000	FEM	Contrat	43 140	10 785	10 785	10 785	10 785	
		1.3.1.2. Frais de mission	↔	↔	↔	↔	UCP	4 000	PNUD	Contra	20 250	5 062.	5 062.	5 062.	5 064	
		1.3.1.3. Equipement et fonctionnement	↔	↔	↔	↔	UCP	4 000	PNUD	Contra	3 150	787	787	787	789	
		1.3.1.4. Etude sur les aires protégées	↔	↔	↔	↔	UCP	4 000	PNUD	Contra	4 950	2 000	1 000	1 000	950	
<b>TOTAL COMPOSANTE 4</b>											<b>172 440</b>	<b>96 184</b>	<b>41 034</b>	<b>17 634</b>	<b>17 588</b>	
<b>SOUS TOTAL FEM</b>											<b>142 290</b>	<b>86 535</b>	<b>34 185</b>	<b>10 785</b>	<b>10 785</b>	
<b>SOUS TOTAL PNUD</b>											<b>30 150</b>	<b>9 649</b>	<b>6 849</b>	<b>6 849</b>	<b>6 803</b>	



<b>OMD VISE</b>		<b>OMD N° 7 : Assurer un environnement durable</b>	
<b>ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II</b>		<b>AXE STRATEGIQUE N° 1 : Accélération de la promotion de l'accès aux services sociaux de base (capital naturel)</b>	
<b>ELEMENTS DE REFERENCE DU CDS-MT</b>		<b>OBJECTIF STRATEGIQUE N°3: Améliorer la qualité des services rendus</b>	
		<b>PROGRAMME 4 : Amélioration de la base de connaissance des ressources naturelles et de l'environnement</b>	

Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Composante PGIES			
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIEES 2008		T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en F CFA en X1000		T1	T2	T3
4.1. Mise en place d'un système d'information et d'une base de données.	4.1.1. Début exploitation du système mis en place.	4.1.1.1. Réaliser un inventaire portant décompte de l'avifaune dans les aires protégées	↕				UCP	62 000	FEM	Contrat	587				Composante 5
		4.1.1.2. Mettre a jour la banque de données régulièrement mise à jour et les résultats publiés dans le site Web du PGIES	↕												
		4.1.1.3. Organiser 15 débats communautaires d'évaluation participative des actions du projet dont au Ferlo, 5 au PNNK, 2 au PNDS et 5 dans les Niayes et un second forum sur la cogestion des AP.			↕	↕	ULP	62 000	FEM	Contrat	3 996			3 996	
		4.1.1.4. Réaliser un dernier passage de recherches sur les espèces endémiques et mondialement menacées.			↕		UCP	62 000	FEM	Contrat	7 587		7 587		
4.2. Personnel, logistique et		4.2.1.1. Salaires Assistants Suivi-	↕			↕	UCP	62 000	FEM	Contrat	4 304	4 304	4 304	4 304	







**OMD N° 7 : Assurer un environnement durable**

**AXE STRATEGIQUE N° 2 : Création de richesse pour une croissance pro pauvre**

**OBJECTIF STRATEGIQUE N°3: Contribuer à la préservation de l'environnement global**

**PROGRAMME 5 : Mise en oeuvre des plans d'action relatifs aux conventions internationales**

Indicateurs de résultats du CDS-MT		Contributions PGIES aux cibles 2008 du CDS-MT	Chronogramme				Partie Responsable	Budget planifié				Répartition trimestrielle du budget x 1 000				Composante PGIES	
IOV CDS-MT	CIBLES PLANIFIÉES 2008		T1	T2	T3	T4		Source des Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant en F CFA X1000	T1	T2	T3	T4		
5.1. Nombre de parcs, de réserves naturelles et de réserves naturelles communautaires où les éco-gardes sont organisés en GIE	5.1.1. Evolution positive	5.1.1.1. Créer un total cumulatif de 15 RNC/UP géré par les écogardes faisant partie intégrante des GIE des CIV		↕													
5.2. Personnel, logistique et fonctionnement		5.2.1.1. Equipement logistique, mobilier de bureau, outils informatiques et de communication audiovisuels. 5.2.1.2. Carburant, lubrifiant, eau, électricité, téléphone, consommable de bureau et maintenance et divers 5.2.1.3. Réfectionner l'ULP du Ferlo. 5.2.1.4. Missions et ateliers 5.2.1.5. Salaires équipe Coordination (Coordonnateur, Responsable Administratif et Financier, Assistant Comptabilité des		↕			UCP	PNUD	Contrat	42 748	6 748	36 000					Composante e 6
				↕			UCP	FEM	Contrat	2 776	694	694	694	694			Composante e 6
				↕			UCP	FEM	Contrat	PM							Composante e 6
				↕			UCP	PNUD	Mission	2 241	1 300	500	241	200			Composante e 6
				↕			UCP	FEM	Contrat	45 850	11 462	11 462	11 462	11 464			Composante e 6
