3285

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE CHARGE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
(AFDS)

RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES

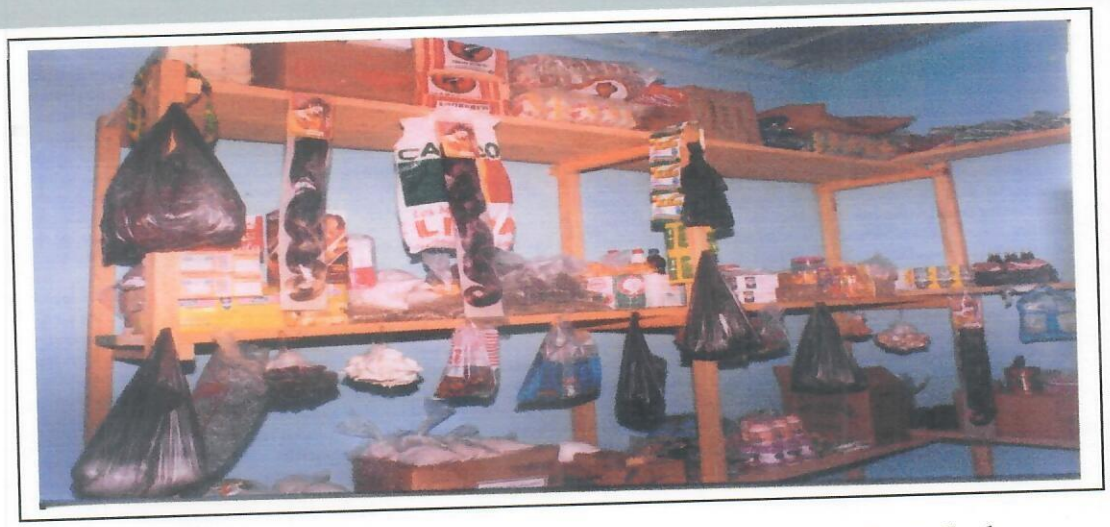

Vue de l'achalandage de la Boutique communautaire de Boyo Seck

OAMF : *GAMMA INGENIERIES*	**Mois : SEPTEMBRE 2004**
Région : LOUGA	**N° du Rapport : 21**
Département : LOUGA	**Date de dépôt : 07 Octobre 2004**

15u

SOMMAIRE

Acronymes 3

Présentation générale des activités exécutées 4

Coordination régionale 5

Préparation 1iers cycles d'exploitation des SP d Syère 6

FGB/ Planification à Syère 6

Réunions sur la reconstitution des ressources à Sakal 7

Journée d'animation sur les décaissements à Syère 7

Campagne de suivi de la mise en œuvre des SP à Sakal 8

FGB / Marketing à Sakal 8

Contraintes et éléments de résolution 10

Niveau d'analphabétisme dans certaines communautés 11

Tableaux de synthèse 12

Rappel de la planification du mois 13

Etat d'exécution des activités prévues 13

Prévisions d'activités pour Juillet 2004 14

Fiche de collecte d'indicateurs 15

Annexe (Illustration graphiques) 16

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

ACRONYMES

AFDS : Agence du Fonds de Développement Social

ARFS : Antenne Régionale du Fonds Social

CASF : Comité d'Animation, de Sensibilisation et de Formation

CGSP : Comité de Gestion de Sous-Projets

CR : Communauté rurale

CTMO : Comité Technique de Mise en Œuvre

DSP : Demande de Sous-Projet

EPB : Evaluation Participative des Besoins

EPP : Evaluation Participative de la Pauvreté

IEC : Information Education Communication

MARP : Méthodes Actives de Recherche Participative

OADC : Opérateur d'Appui au Développement Communautaire

OAMF : Opérateur d'Appui à la Micro-Finance

OCB : Organisations Communautaires de Base

SP : Sous-Projet

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

.1.
PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES EXECUTEES

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

GAMMA INGENIERIES, Opérateur d'Appui à la Micro-Finance (OAMF) de l'Agence du Fonds de Développement Social 5AFDS) dans le département de Louga a eu à réaliser les activités suivantes durant le mois de Septembre 2004 :

- Réunion régionale de coordination
- Préparation des cycles d'exploitation des SP de Syère
- FGB / Planification à Syère et Marketing à Sakal
- Réunions de rappels de l'échéancier de remboursement des SP relatifs au commerce à Sakal
- Journées d'animation sur les décaissements à Syère
- Campagne de suivi des activités de mise en œuvre à Sakal

1. Coordination régionale

L'opérateur a participé durant la journée du 1er septembre 2004 au siège de l'OADC – ACA à Kébemer à une réunion de coordination régionale. Instituée à l'initiative du coordinateur de l'ARFS, cette rencontre tournante réunit autour de l'antenne les opérateurs de l'AFDS dans la région.

Ce 1er septembre 2004, l'ordre du jour portait sur les points suivants :

- Restitution des problèmes rencontrés
- Restitution des activités menées
- Panification des activités à mener

En ce qui le concernait, *GAMMA INGENIERIES* a fait une communication sur les questions ci-dessous :

- La mobilisation des apports à Syer ;
- Préparation des premiers cycles d'exploitation des SP d'embouche ;
- Participation à la FGB ;
- Journées d'animation sur les décaissements à Sakal.

A la suite de la présentation des différentes activités menées par les opérateurs, ces derniers ont échangé sur les questions suivantes :

- La mobilisation des apports
- L'affectation des terrains dans les communes
- La libération des fournitures pour la FGB
- Le ciblage des quartiers bénéficiaires dans les communes
- Le problèmes de l'analphabétisme des communautés

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

- Les contrats des entrepreneurs

2. Préparation des cycles d'exploitation des SP de Syère

Suite à la mobilisation des apports et au virement des financements de 9 communautés de Syère, l'Opérateur a organisé des réunions de démarrage de la mise en œuvre des SP de la dite communauté rurale durant la période du 2 au 8 septembre 2004. Ces séances de travail avec les communautés ont porté essentiellement sur :

- L'installation des commissions d'achat, de réception et de supervision et le rappel des procédures d'acquisition
- La mise en place et commentaire du canevas du PV d'achat des sujets
- Les procédures de recrutement de berger
- Le rappel des activités à mener avec le montant à décaisser
- La répartition du budget à décaisser
- La convocation des communautés pour la FGB / Planification.

Ces réunions ont concerné 10 villages de la communauté rurale de Syère dont les bénéficiaires ont mobilisé complètement leur apport pour le démarrage effectif de la mise en œuvre de leur sous-projet. Pour rappel, l'AFDS cible dans cette communauté rurale un total de 12 villages.

3. FGB à Syère sur la planification

Le quatrième module de la formation en gestion de base à Syère a eu lieu dans la période du 13 au 16 septembre 2004. Il portait sur la planification et a vu la participation :

- des représentants de 12 communautés cible à raison de 4 par OCB porteuse de sous-projet
- de quatre relais communautaires de Syère
- des agents de l'Opérateur
- du formateur.

Le plan du module comportait les sous-thèmes ci-dessous :

- pourquoi la planification participative ?
- le choix de nos sous-projets
- construire l'image de succès
- la rentabilité de notre activité
- le plan d'action et d'exécution

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

- les sources de financement
- le dossier de financement
- la coordination et le suivi de l'activité
- l'évaluation de l'activité

Le module a été déroulé sous forme de deux ateliers qui ont été clôturés par des séances d'évaluation jugées concluantes.

4. Réunions sur l'échéancier de reconstitution à Sakal

Dans le cadre du suivi des engagements des communautés, l'Opérateur a tenu cinq réunions dans la communauté rurale de Sakal portant sur l'échéancier de reconstitution des ressources. Ces réunions ont permis de revenir sur la description de l'activité et du cycle d'exploitation de chaque sous-projet avec les bénéficiaires dont l'échéancier est arrivé à terme.

Cependant l'ordre du jour de ces réunions a porté essentiellement sur la pérennisation des sous-projets et a permis aux communautés d'être en phase avec le plan de reconstitution avec le dépôt du premier remboursement du capital dans leurs comptes domiciliés au niveau de la MECAPP de Keur Momar Sarr.

Après donc trois mois de mise en œuvre effective, seules 6 OCB ont vu leur premier échéancier arrivé à terme.

5. Journée d'animation sur les décaissements à Syère

Suite au premier virement des ressources de neuf sous-projets de la communauté rurale de Syère, l'Opérateur a organisé le 18 septembre 2004, en partenariat avec la MECAPP, une journée d'animation sur les décaissements. Ces premiers fonds de Syère devaient servir à l'achat des sujets pour les sous-projets d'embouche et à la fabrication de pirogues pour le sous-projet de pêche continentale.

L'Opérateur a profité de cette occasion pour revenir encore sur les principales servitudes de l'exécution financière, en insistant notamment sur les sûretés qui doivent accompagner les dépenses.

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

6. Campagne de suivi des activités de mise en œuvre de SP à Sakal

Suite au décaissement de la deuxième tranche des financements de 21 sous-projets de la communautés rurale de Sakal, l'opérateur a mené une campagne de suivi de l'effectivité des transactions qui ont été planifiées par les bénéficiaires dans le cadre d'un démarrage total de leur sous-projet. Cette tournée qui s'est déroulée du 17 au 23 septembre 2004 en partenariat avec la consultante formatrice en FGB de la région de Louga a permis à l'Opérateur de faire le point des dépenses effectuées avec les communautés en présence de la consultante. Ces dépenses ont porté essentiellement sur :

- l'achat des sujets pour les sous-projets d'embouche
- l'achat des marchandises pour les sous-projets de boutique communautaires

Au cours de ces séances de travail, l'Opérateur a assisté les bénéficiaires dans la mise à jour des documents de gestion du sous-projet notamment le journal de banque et le journal de caisse.

7. FGB à Sakal sur le Marketing

Le cinquième et dernier module de la formation en gestion de base à Sakal a eu lieu dans la période du 24 au 28 septembre 2004. Il portait sur le marketing et a vu la participation :

- des représentants de 29 communautés cibles à raison de 4 par OCB porteuse de sous-projet
- de huit relais communautaires
- des agents de l'opérateur
- du formateur

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

Le plan du module comportait les sous-thèmes ci-dessous :

- l'étude de notre marché
- nos concurrents
- nos clients
- le choix de notre produit
- nos prix
- nos canaux de distribution
- la promotion

En plus de ces sous-thèmes théoriques, les participants avec l'appui du formateur, ont appris et pratiqué la fabrication et l'écoulement des produits locaux notamment :

- le savon
- les jus de fruits
- les techniques de conservation des légumes

La clôture de ce cinquième module qui marque la fin du déroulement de la FGB dans cette communauté rurale a vu la participation du président de la dite communauté rurale et a été l'occasion pour les acteurs de formuler toutes les recommandations portant sur la pérennisation des sous projets des communautés.

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

.2.
CONTRAINTES ET ELEMENTS DE RESOLUTION

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

L'analphabétisme dans certaines communautés bénéficiaires

Avec le suivi des activités de mise en œuvre des sous-projets de la communauté rurale de Sakal, les bénéficiaires ont l'obligation d'élaborer des rapports d'activités et de mettre à jour les documents comptables. Certaines communautés éprouvent encore des difficultés à cet égard, du fait notamment du fait d'un niveau d'analphabétisme très élevé.

Face à cette situation et sans se substituer aux communautés, l'Opérateur multiplie les séances d'animation dans le sens du renforcement des capacités pour une bonne élaboration des pièces et documents contractuels.

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

.3.
TABLEAUX DE SYNTHESE

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

3.1. Rappel de la planification du mois

Activités	Indicateurs	Période d'exécution	Ressources	
			Humaines	Matérielles
Réunions d'appui au décaissement de la première tranche à Syère et suivi de la restitution de la FGB	12 OCB à appuyer	Du 1er au 10	5	- véhicule -matériels informatiques - markers - tableaux padex
Suivi des activités de transaction des communautés et de la restitution de la FGB et appui de la mise en jour des documents comptable à Sakal	28 OCB à appuyer	Du 10 au 20	5	- véhicule -matériels informatiques - markers - tableaux padex
Poursuite de la FGB à Syère et à Sakal	3 modules à dérouler	Du 20 au 30	5	- véhicule - matériels informatiques - markers - tableaux padex

3.2. Niveau de réalisation des activités

Activités	Réalisations			Indicateurs	Observations
	Oui	Non	Niveau de réalisation		
Réunion d'appui au décaissement de la première tranche à Syer et suivi de la restitution de la FGB à Syère			Activité réalisée	9 OCB ont décaissé	- Seules 3 OCB n'ont pas encore décaissé du fait du non virement de leur financement
Suivi des activités de transaction des communautés et de restitution de la FGB et appui à la mise à jour des documents comptables			Activités réalisées	21 OCB ont démarré leur transaction	- Seules 21 OCB étaient concernées - Finalisation des transactions en octobre 2004
Poursuite de la FGB à Syère et à Sakal			Activité réalisée	2 modules déroulés	- Le seul module de la FGB sui reste sera déroulé en octobre 2004

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

3.3. Prévision d'activités pour le mois d'octobre 2004

Activités	Indicateurs	Période d'exécution	Ressources	
			Humaines	Matérielles
Poursuite de l'appui à la mise à jour des documents à Sakal	28 OCB à Appuyer	Du 1er au 6	5	- véhicule - matériels informatiques - markers - tableaux padex
FGB à Syère	1 module à dérouler	Du 7 au 11	5	- véhicule - matériels informatiques - markers - tableaux padex
Appui à la mise à jour des documents comptable à Syère	12 OCB à appuyer	Du 12 au 20	5	- véhicule - matériels informatiques - markers - tableaux padex
Séminaire de formation des auxiliaires vétérinaires à Syère	27 auxiliaires à former	Du 21 au 31	5	- véhicule - matériels informatiques - markers - tableaux padex

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

3.4. Fiche de collecte des indicateurs

Indicateurs	Résultats		Observations
	Septembre	Cumul	
Information / Communication			
Nombre de séances d'animation et d'information organisées	40	495	- 12 réunions à Syer - 28 réunions à Sakal
Nombre d'OCB sensibilisées et informées	41	572	Toutes les OCB cibles informées
Réalisation des EPB			
Nombre d'EPB réalisées	-	40	40 villages sont ciblés
Nombre de SP exprimés	-	41	1 DSP par village sauf Sakal village qui a deux DSP
Nombre de rapports EPB élaborés	-	42	- 40 rapports EPB villages - 2 rapports de synthèse pour les 2 CR cibles
Mise en place des comités du SP			
Nombre de CGSP mise en place	-	41	Tous les comités sont montés
Nombre de membres par CGSP	-	6	Compte non tenu de deux commissaires aux compte
Nombre de femmes en moyenne présentes dans le CGSP	-	5	Majorité femmes
Nombre de jeunes en moyenne présents dans le CGSP	-	2	La tranche d'âge des jeunes est touchée par l'exode rural
Préparation des DSP			
Nombre de DSP préparées par les OCB	-	42	1 DSP par village, sauf Sakal où 2 DSP ont été identifiés
Nombre de DSP destinés aux femmes	-	32	Majorité de femmes
Nombre de DSP évaluées par le CTE	-	42	Les deux CR ont vu leur SP évalués
Nombre de DSP validées par le CTE	-	40	Seul un village a vu son SP ajourné 2 fois
Nombre de DSP financés	6	37	Seuls trois SP ne sont pas encore financés
Exécution des sous-projets			
Nombre de SP démarrés	9	37	Seuls trois SP n'ont pas encore démarrés
Nombre de SP en maturité	-	6	- 2 SP de commerce ruraux - 4SP de central d'achat

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

.4.
ANNEXE
(Illustrations graphiques)

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

Coupes du cheptel du SP d'embouche de Gade N. Peulh

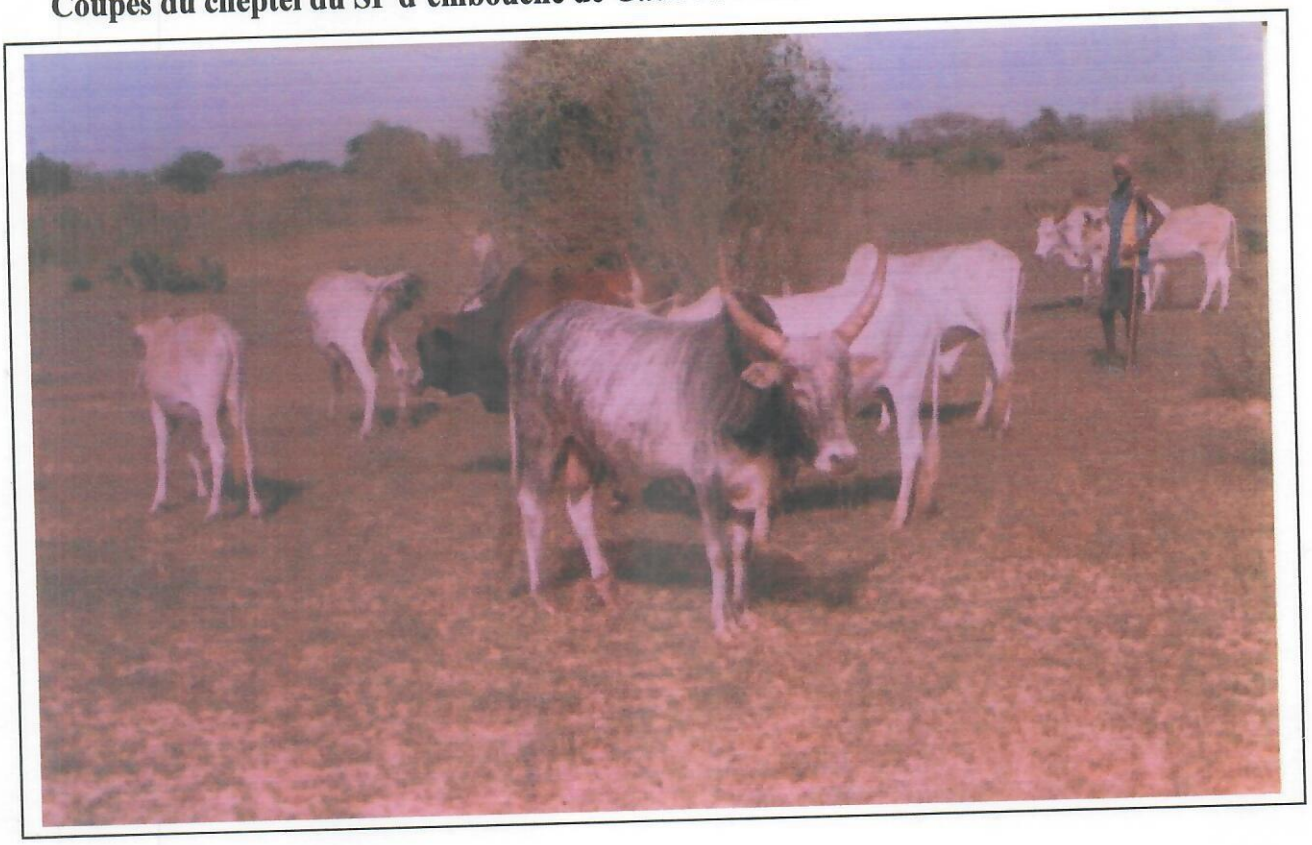

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

Vue de l'atelier de FGB sur le Marketing à Sakal

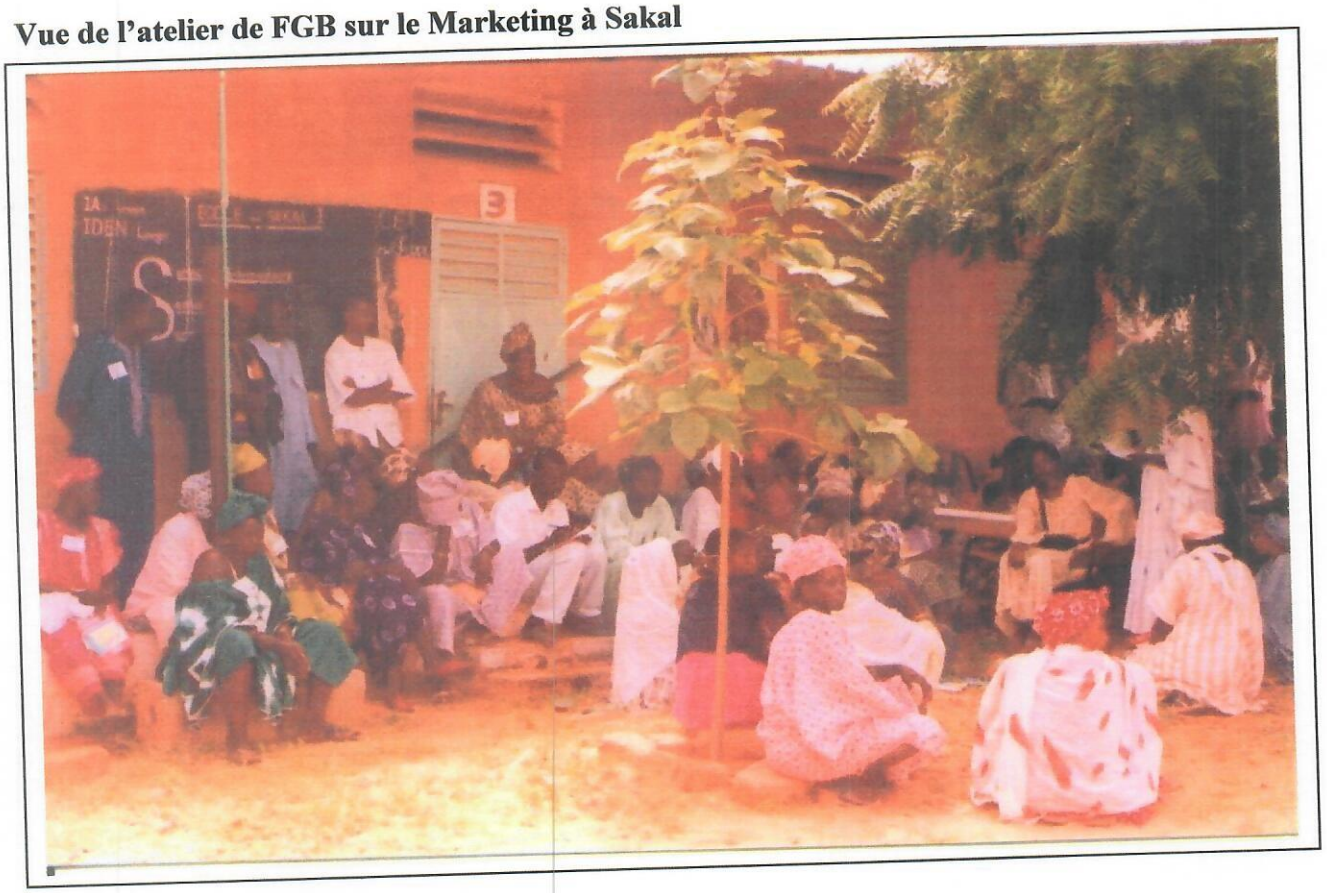

Vue de l'achalandage de la Boutique communautaire de Boyo Seck

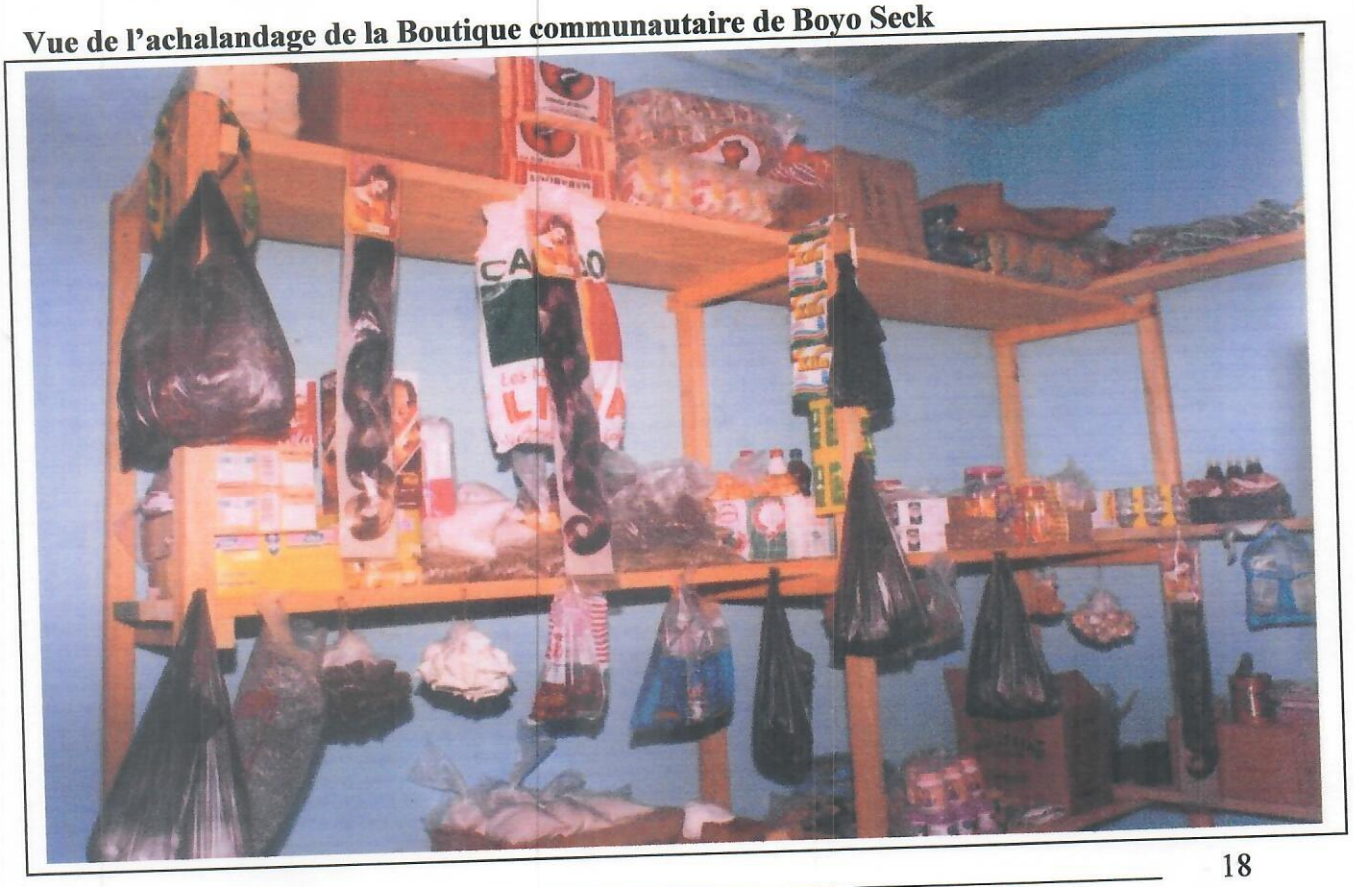

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77
